

建設中の事業の進捗状況について

北海道増設設置工事

北海道増設事業は、平成 22 年 12 月の入札後ただちに設計業務に入り、平成 23 年 11 月に北海道より施設設置許可をいただき同年 12 月に着工しました。着工後は建築工事として杭打ち、基礎工事を進め、今年 3 月時点では鉄骨建て方工事に着手したところです。機械工事については 2 月から溶融炉のアンカー部分の据付を開始し、今後建築工事の進捗と共に機械品の搬入、据付を進めてまいります。

○これまでの経緯


平成 23 年

- 6 月 7 日 施工業務契約締結
- 7 月 25 日 施設設置許可申請提出
- 11 月 25 日 施設設置許可証受領
- 12 月 7 日 起工式
- 12 月 8 日 現地工事着工



平成 24 年 1 月末時点（基礎工事中）

○処理フロー図

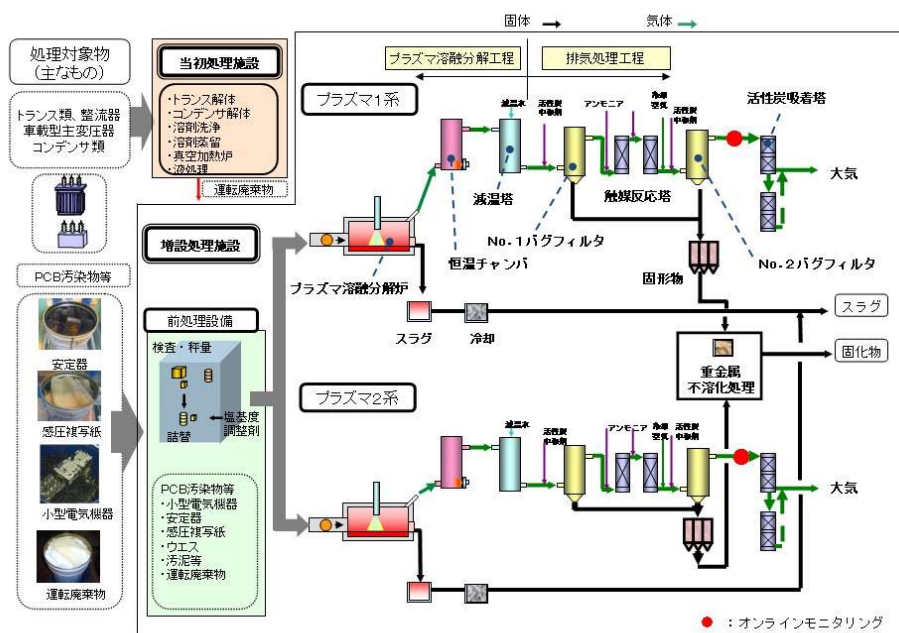

○今後の主なスケジュール

特別高圧受電： 平成 24 年 10 月頃

単体機器調整： 平成 25 年早々

操業開始： 平成 25 年夏頃

(北海道増設建設工事スケジュール表)

項目	平成23年	平成24年	平成25年
主要マイルストーン	12/8 ▼ 建築工事着工	▼ プラント工事着工	▼ 受電 ▼ 試運転開始
設計	[Green bar spanning from start of 2023 to start of 2024]		
建築工事	<p>杭・基礎・土間工事 [Yellow bar]</p> <p>鉄骨工事 [Yellow bar]</p> <p>デッキコンクリート・機械基礎工事 [Yellow bar]</p> <p>屋根工事 [Yellow bar]</p> <p>防水・内装工事 [Yellow bar]</p>		
外構工事	<p>外構整地・路盤・フェンス工事 [Grey bar]</p> <p>雨水排水・舗装工事 [Grey bar]</p>		
プラント工事	<p>機器据付工事 [Green bar]</p> <p>配管・保温・塗装・電気計装工事 [Green bar]</p>		
試運転	[Orange bar spanning from late 2024 to early 2025]		
