


東京 P C B 廃棄物処理施設の建設状況

平成 16 年	7 月 1 日	建屋工事開始 (杭打ち工事開始)
	7 月 21 日	建屋基礎コンクリート打設開始
	8 月 3 日	起工式
	9 月 15 日	建屋鉄骨建て方開始

< 今後の主な予定 >


平成 16 年	10 月下旬	建屋床面コンクリート打設開始
	11 月初旬	建屋外壁取り付け開始
	12 月初旬	プラント(機械・電気機器)工事開始
平成 17 年	1 月中旬 ~	洗浄装置搬入・据付
		脱塩素化分解 分解槽搬入・据付
	2 月下旬	水熱酸化分解 反応器搬入・据付
	6 月中旬	廃棄物処理法使用前検査
	7 月初旬	模擬廃棄物試運転開始
	8 月中旬	P C B 廃棄物試運転開始
	11 月 1 日	操業開始

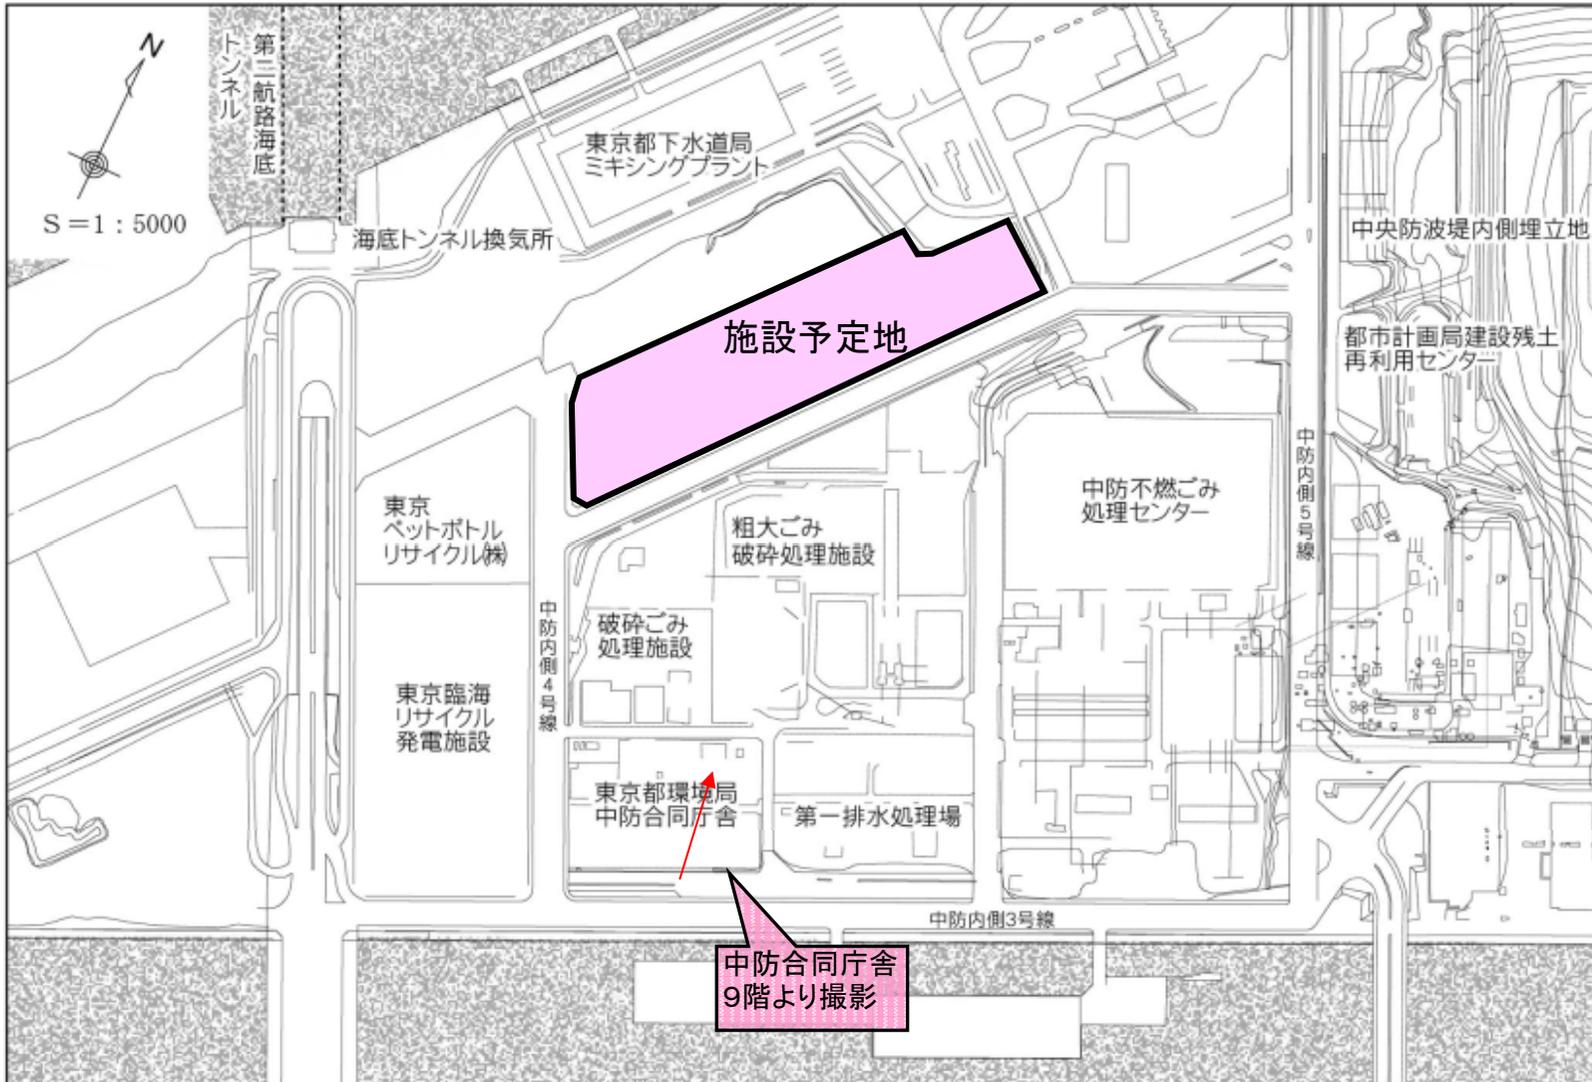

中防合同庁舎9階より撮影
(平成16年10月13日)



撮影場所

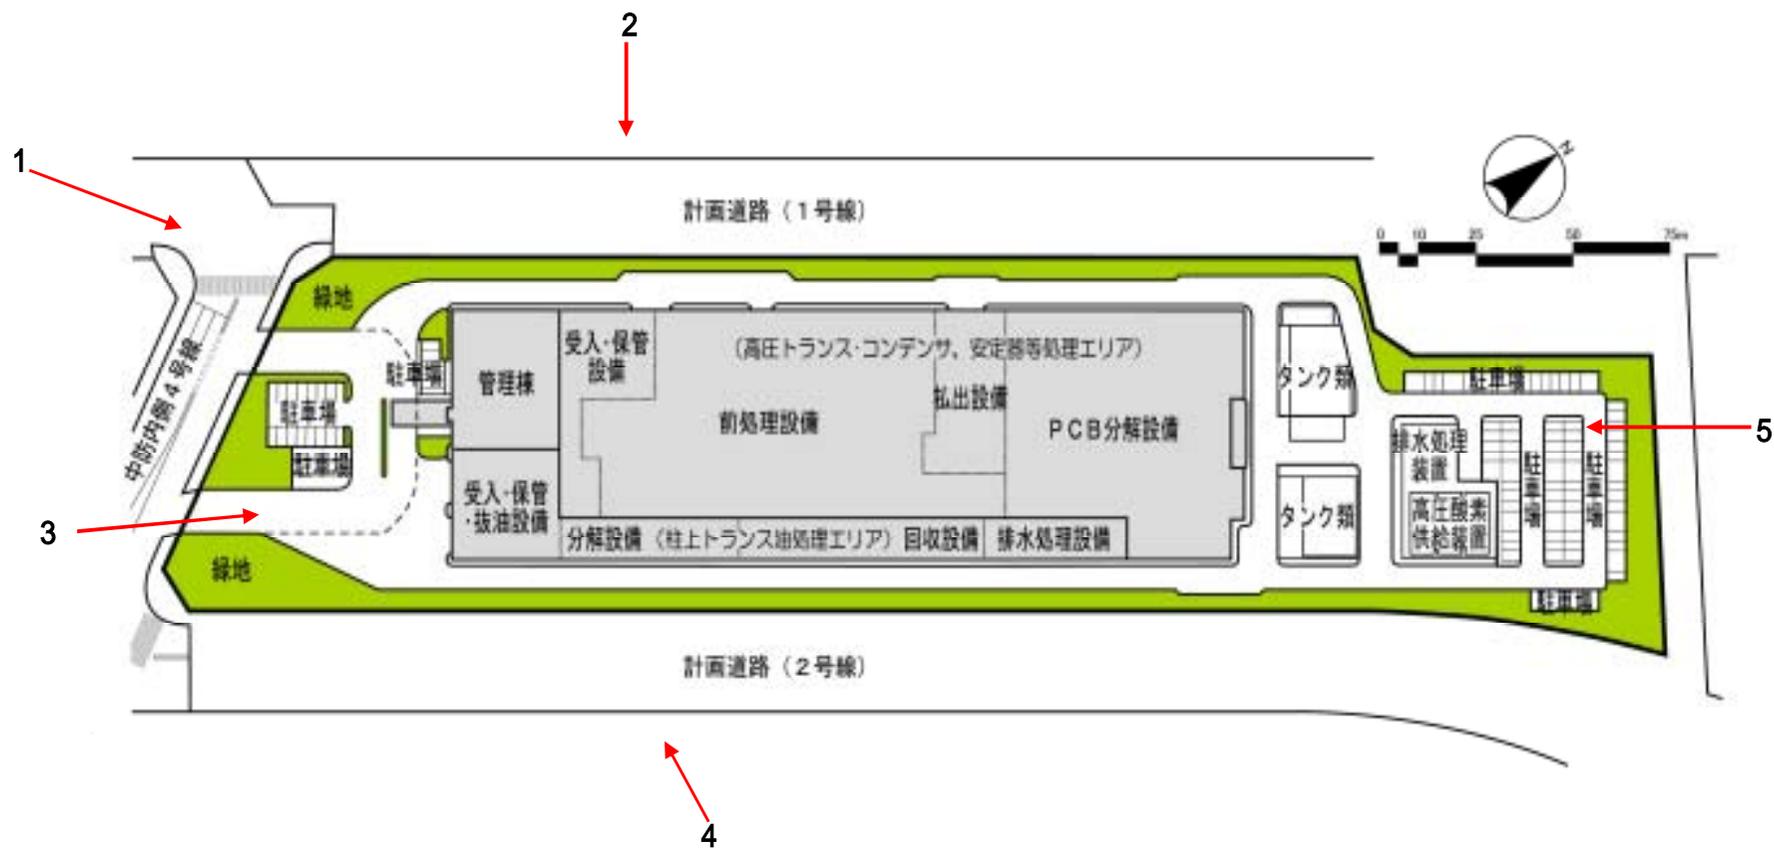







摄影 4



