


2. 低濃度PCB処理施設(プラント設備)の解体撤去工事

1) 配置図

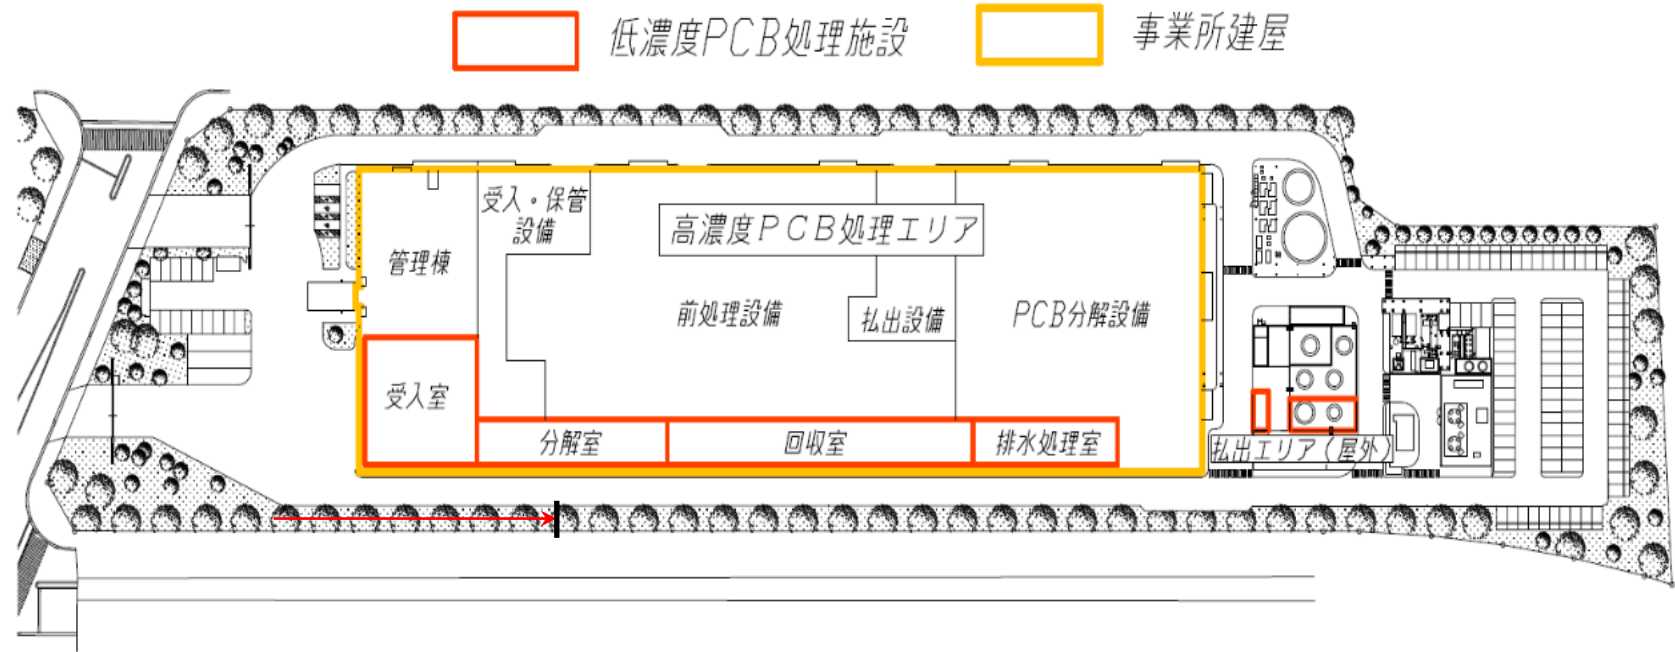

2. 低濃度PCB処理施設(プラント設備)の解体撤去工事

2) 解体撤去工事のスケジュール

- 受入室の設備の解体撤去は10月末に完了
- 現在、分解室の解体・撤去工事を実施中
- PCB接触設備の解体撤去物は、低濃度PCB廃棄物として処理
(無害化処理認定施設へ搬出、初便は11月1日)
- PCB非接触設備は、通常の解体物として処理 (産廃処理または有価物売却)

低濃度PCB処理施設(プラント設備)解体撤去工事の概略スケジュール

工事エリア		2023(令和5)年				2024(令和6)年		
		9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
準備作業						凡例; これまでの実績 今後の予定		
受入室	PCB接触設備							
	PCB非接触設備							
分解室	PCB接触設備							
	PCB非接触設備							
回収室・排水処理室								
無害化処理払出し								

* PCB接触設備；プラント稼働時、微量PCBの接触があった設備
着工前までに該当性判断基準以下(非PCBレベル)まで除去分別
(洗浄や拭き取り等によりPCB濃度を下げること) 済み

2. 低濃度PCB処理施設(プラント設備)の解体撤去工事の状況

2) 設備概要

