


# 不要設備の先行解体撤去(2023年度～2026年度)

## 先行解体対象設備の設置場所


(1階)

リン含有PCB前処理設備(81m<sup>2</sup>)

・撤去済:2024/3

 ;解体撤去予定

 ;撤去済

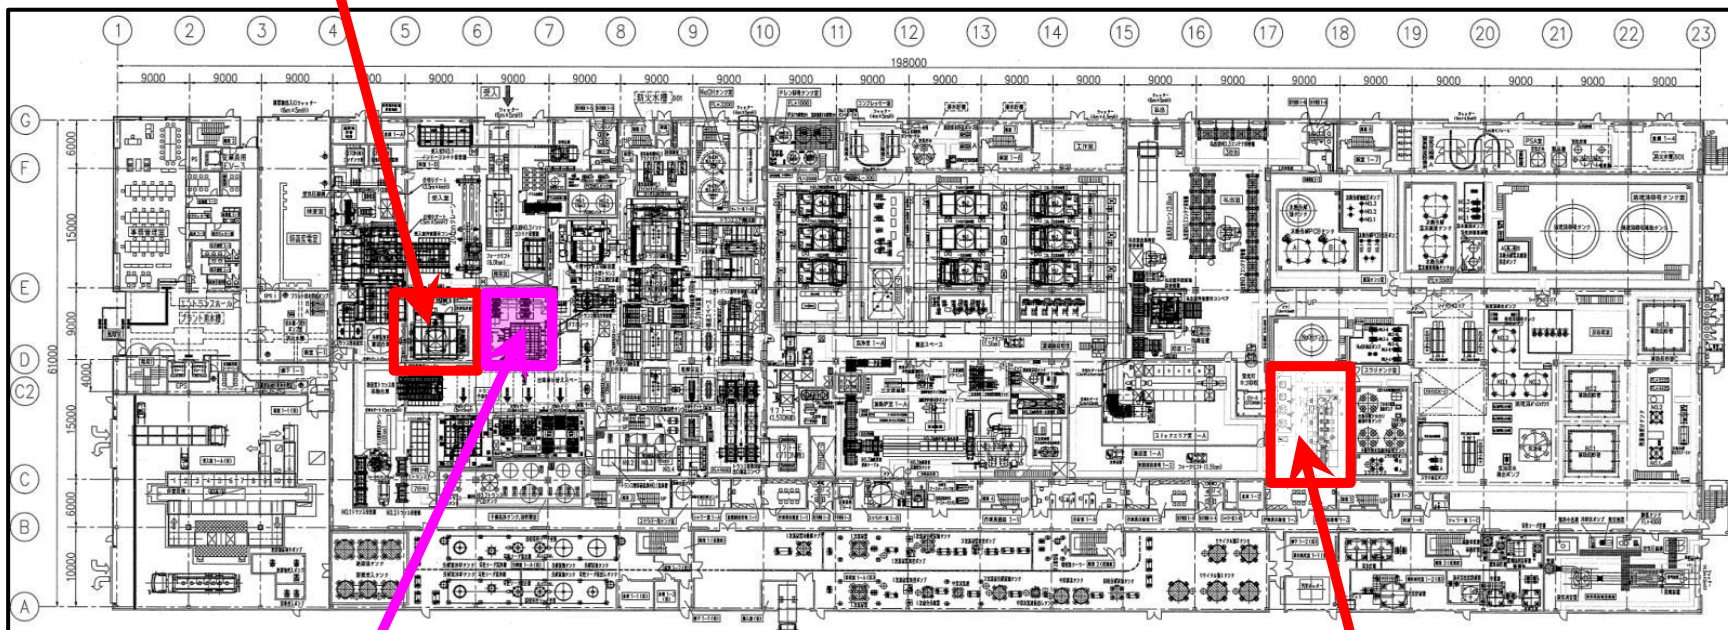

除染室の抜油・排気処理設備(81m<sup>2</sup>)

・撤去予定:2026/7-9

廃粉末活性炭スラリー化設備(270m<sup>2</sup>)

・撤去済:2025/4

# 不要設備の先行解体撤去(2023年度～2026年度)

## 先行解体対象設備の設置場所


(3階)

安定器等処理設備(880m<sup>2</sup>)

・撤去済:2026/1

 ;解体撤去工事中

 ;撤去済

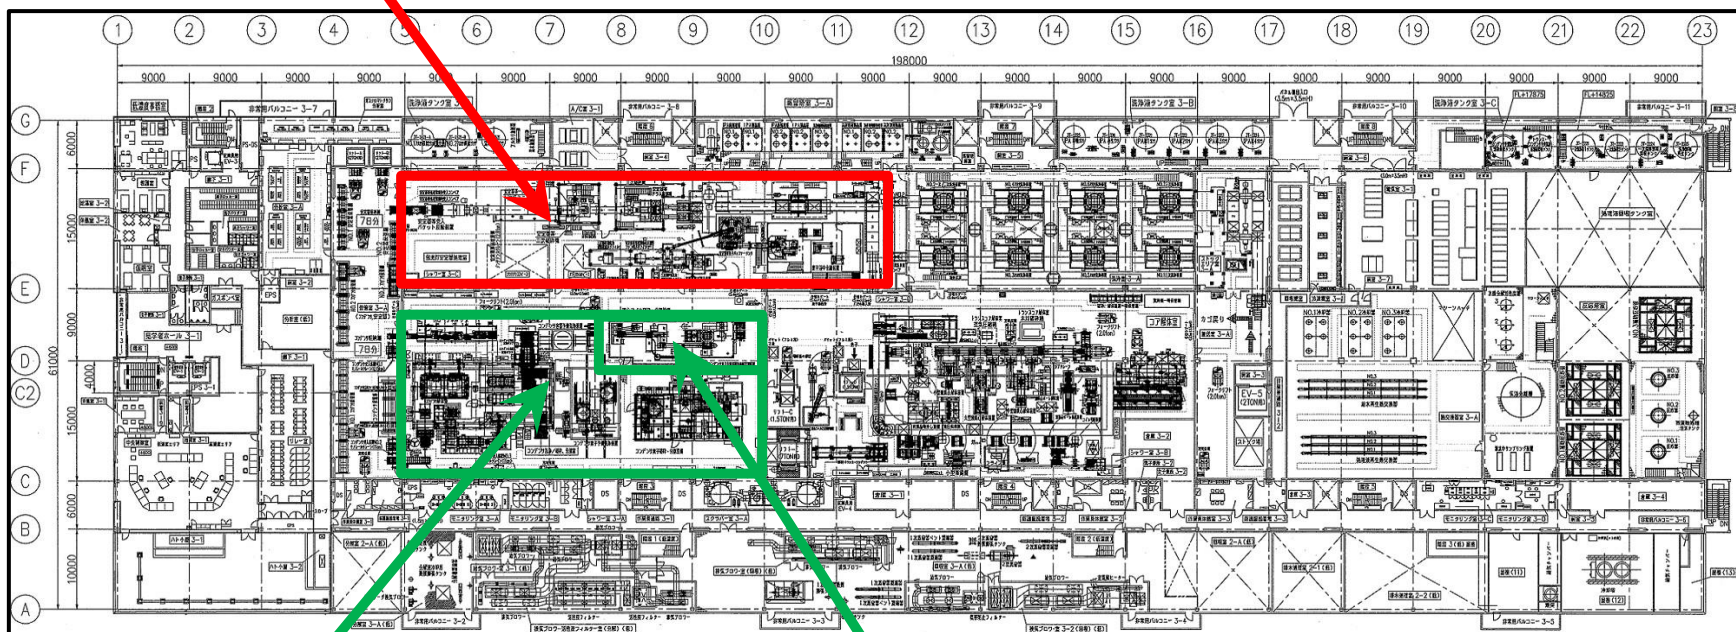

コンデンサー解体設備(920m<sup>2</sup>)

・PCBの除去分別済:2025/1-10

鉄心コイル・破碎分別設備(160m<sup>2</sup>)

・PCBの除去分別済:2025/1-10
