


先行工事～無事故でグローブボックス内の機器撤去が完了～

令和元年6月17日より、グローブボックス内の機器の撤去に着手し、無事に完了しました。
当該工事ではグリーンハウスを設置して、グローブボックス内には化学防護服、空気呼吸器等を装着して入り、安全を最優先して作業を行いました。

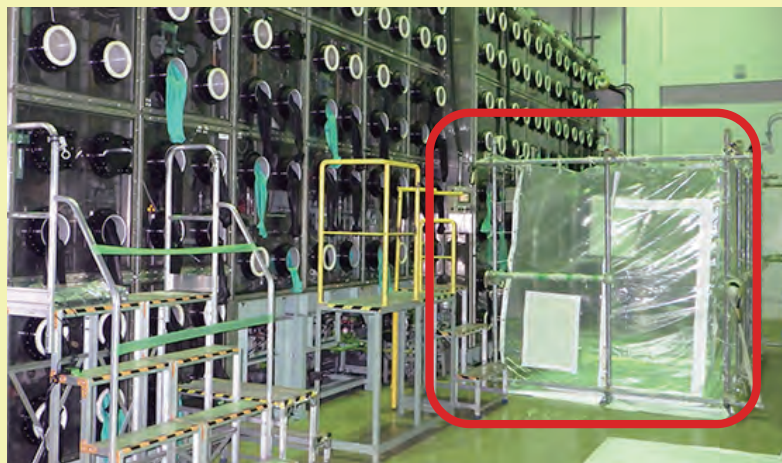

グリーンハウスの設置

グローブボックスへの出入り口に、外部にPCBが漏洩しないようにグリーンハウスを設置し、グリーンハウスを通して出入りします。


※赤枠内がグリーンハウス

作業員の安全を確保するため、化学防護服、手袋、長靴を着用し、空気呼吸器も装備しています。


汚染防止のため、退出時はグリーンハウスで着替え、脱衣した化学防護服は専用容器に保管し、無害化处理します。



化学防護服 + 空気呼吸器での作業

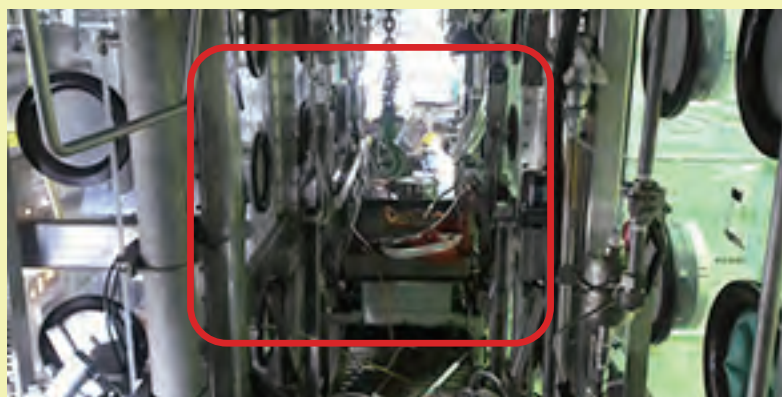

内部機器撤去前



内部機器撤去後
