


# 土壤貯蔵施設（双葉②工区）における 空間線量率の測定地点（月次測定）〈貯蔵中〉



☆: 施設の位置

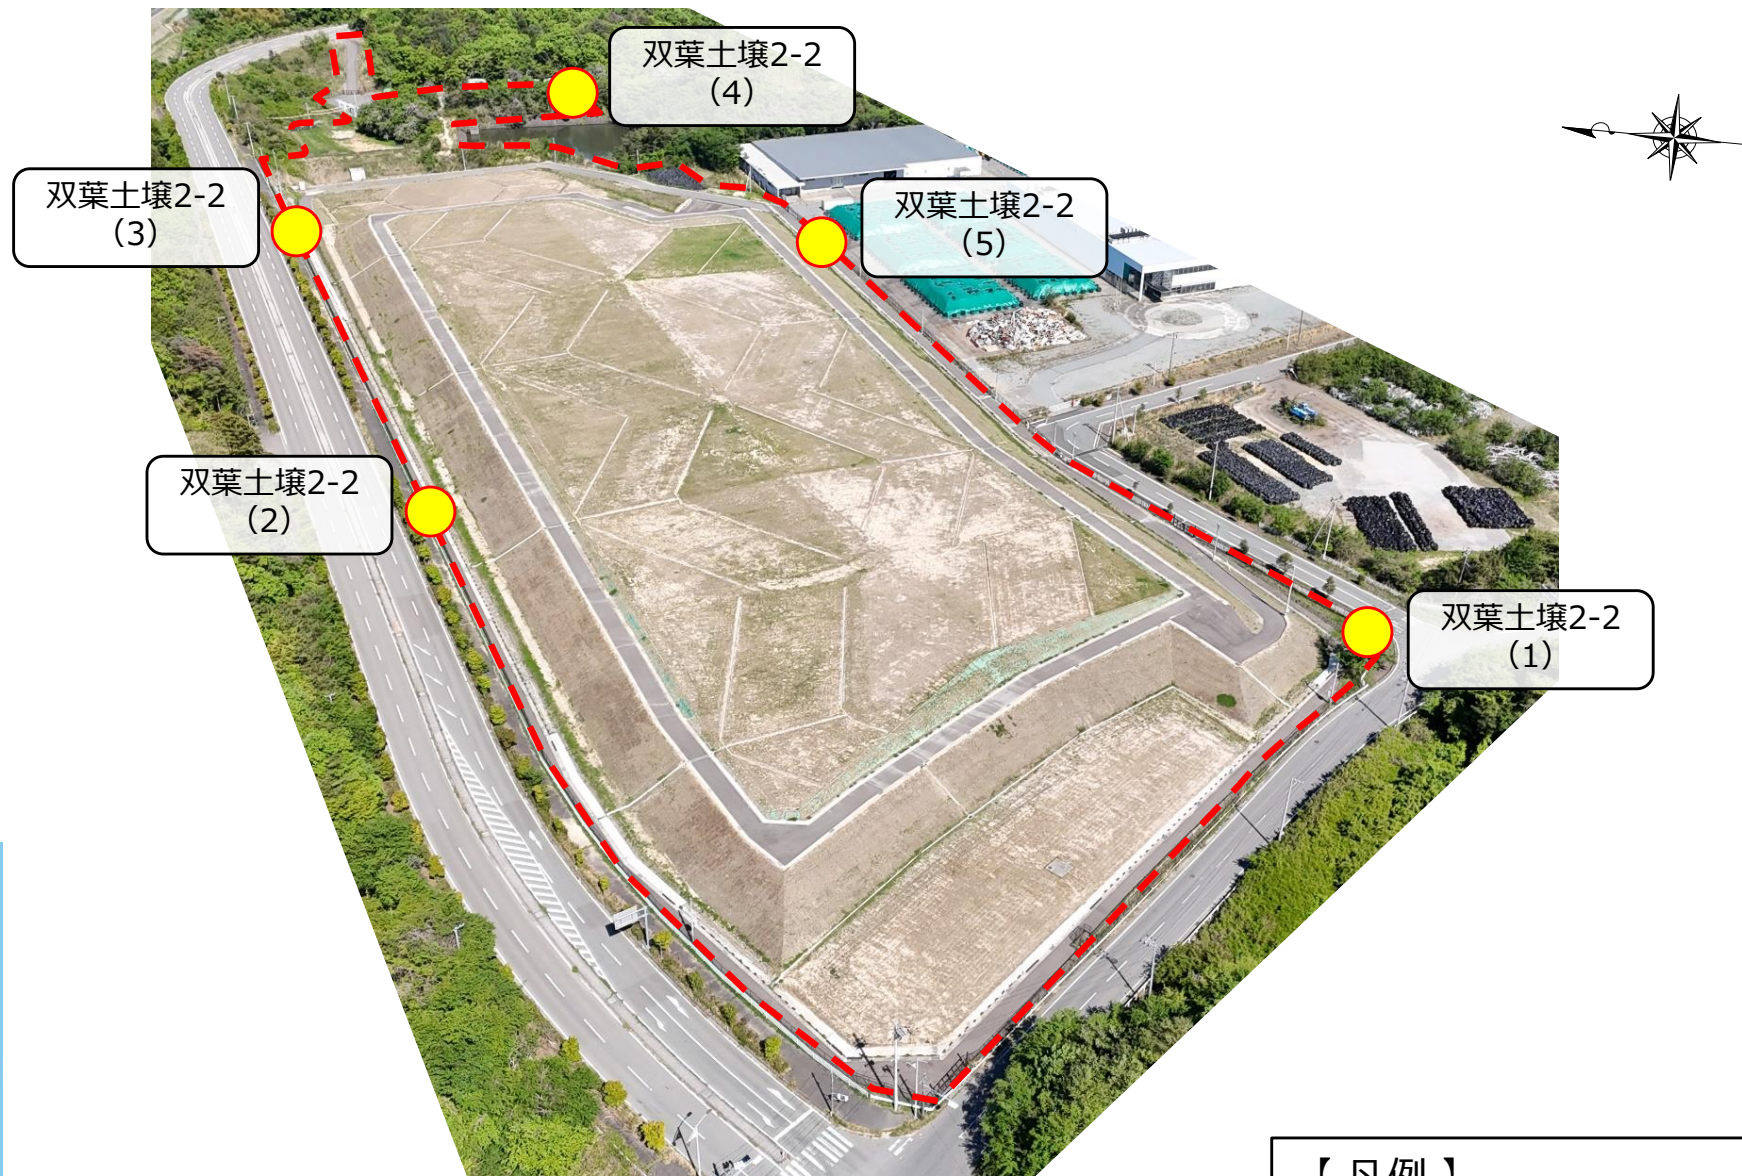

【凡例】  
● : 空間線量率測定地点

## 土壤貯蔵施設(双葉②工区)における 空間線量率の測定結果(月次測定)

<空間線量率>


[ $\mu$  Sv/h]

日付 \ 地点	双葉土壤2-2(1)	双葉土壤2-2(2)	双葉土壤2-2(3)	双葉土壤2-2(4)	双葉土壤2-2(5)
(工事前 2018年3月15日)	2.73	3.20	2.04	2.02	4.53
(貯蔵前 2019年5月13日)	1.91	0.92	1.10	0.96	0.27
2026年5月13日	1.21	0.66	0.63	0.62	0.19

凡例    工事前:施設造成工事開始前    貯蔵前:施設完成後、分別土壤搬入前
--

# 土壌貯蔵施設（双葉②工区）における 周辺環境測定地点（月次測定）＜貯蔵中＞ ①

4頁参照

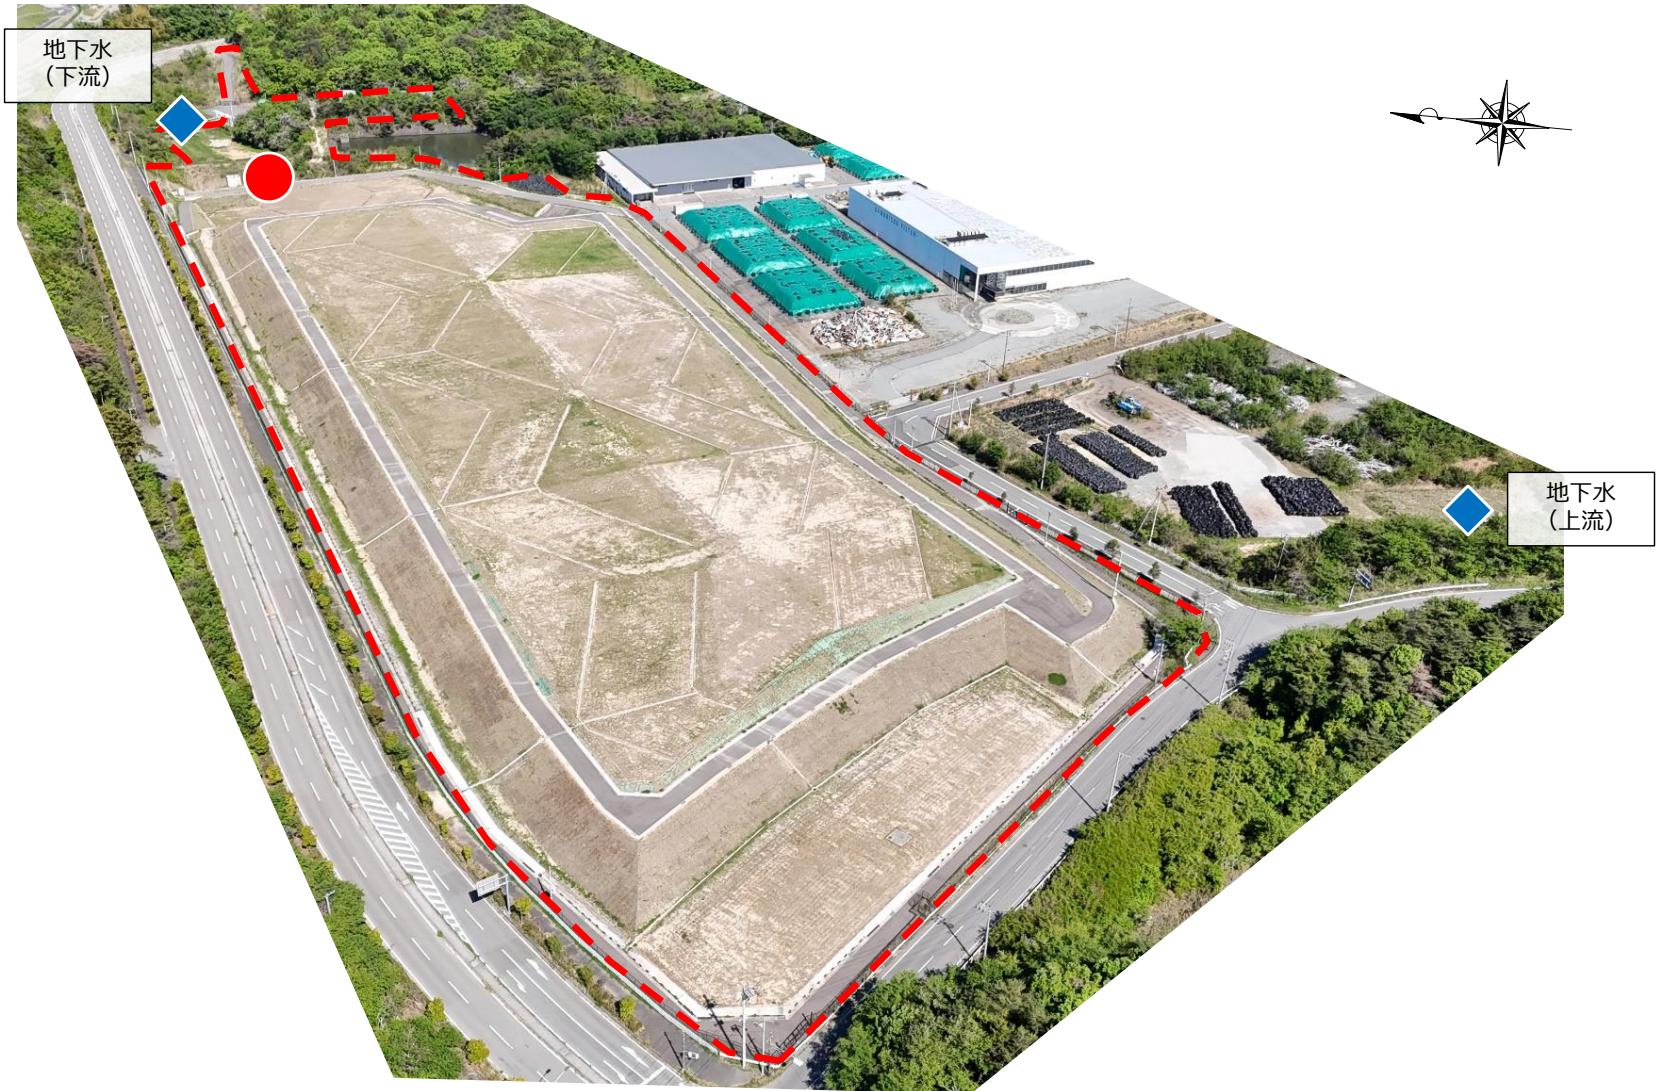

地下水  
(下流)

地下水  
(上流)

☆: 施設の位置



【凡例】



: 地下水（井戸）中の電気伝導率等、放射能濃度



: 放流先河川の放射能濃度




: 地下水（集排水設備）中の放射能濃度



: 敷地境界線

# 土壤貯蔵施設（双葉②工区）における 周辺環境測定地点（月次測定）＜貯蔵中＞ ②

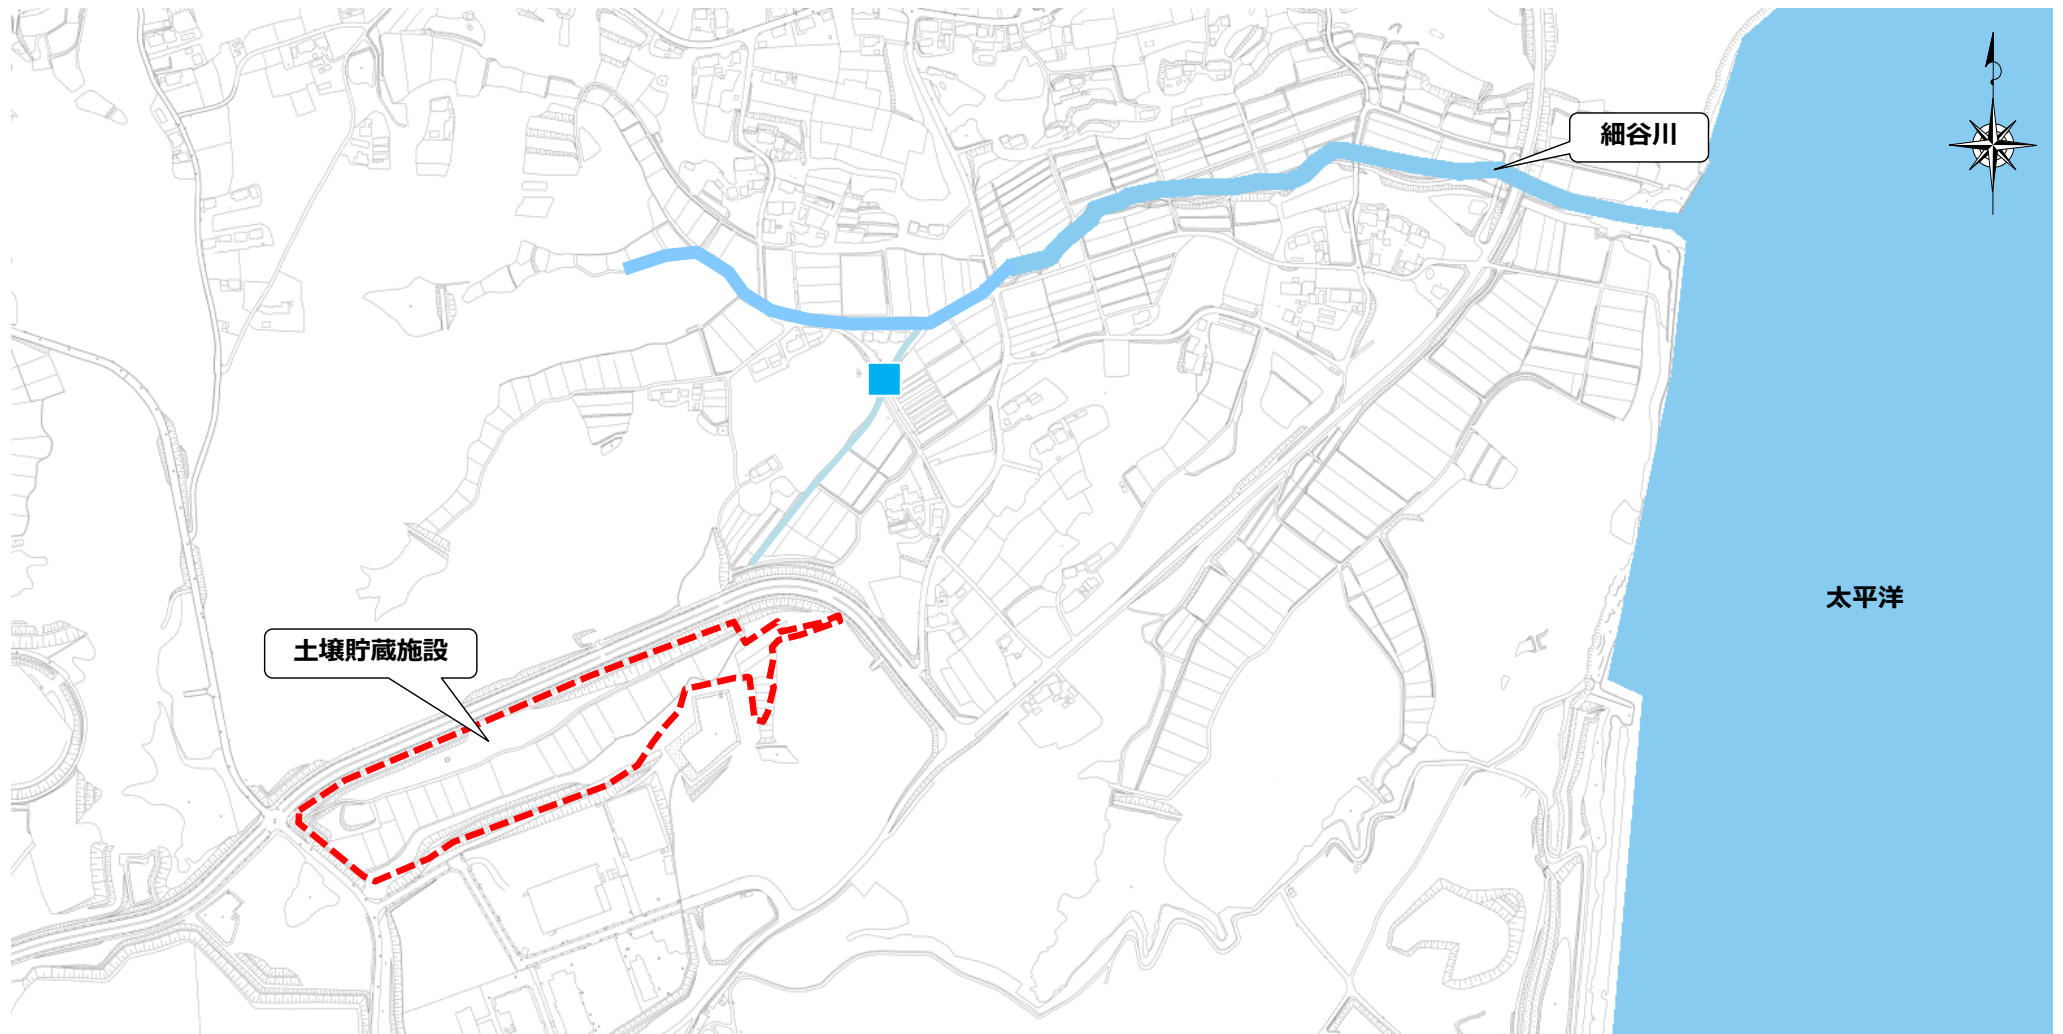

【凡例】

■ : 河川水観測地点    - - - : 敷地境界線

# 土壌貯蔵施設（双葉②工区）における 周辺環境測定結果（月次測定）2026年4月

## ◆地下水（井戸）中の電気伝導率等

測定地点	測定項目		電気伝導率 (mS/m)
	測定日		
上流	2019/5/8	(稼働前)	61
	2026/4/9	(貯蔵中)	33
下流	2019/5/8	(稼働前)	18
	2026/4/9	(貯蔵中)	24

測定地点	測定項目		塩化物イオン濃度 (mg/L)
	測定日		
上流	2019/5/8	(稼働前)	8.0
	2026/4/9	(貯蔵中)	13
下流	2019/5/8	(稼働前)	10
	2026/4/9	(貯蔵中)	11

## ◆地下水（井戸）中の放射能濃度

測定地点	測定項目		Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
	測定日			
上流	2019/5/8	(稼働前)	ND	ND
	2026/4/9	(貯蔵中)	ND	ND
下流	2019/5/8	(稼働前)	ND	ND
	2026/4/9	(貯蔵中)	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

## ●地下水（集排水設備）中の放射能濃度

測定項目		Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
測定日			
2019/5/21	(稼働前)	ND	ND
2026/4/7	(貯蔵中)	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

## ■放流先河川の放射能濃度

測定項目		Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
測定日			
2019/4/24	(稼働前)	ND	ND
2026/4/9	(貯蔵中)	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

放射能濃度[Bq/L]の基準：セシウム134の濃度/60+セシウム137の濃度/90≤1

※本工区の浸出水処理施設は2025年4月以降、稼働停止中。

浸出水処理は土壌貯蔵施設（大熊②工区）の浸出水処理施設において実施。
