


土壌貯蔵施設（大熊②工区）における 空間線量率の測定地点（月次測定）＜貯蔵中＞

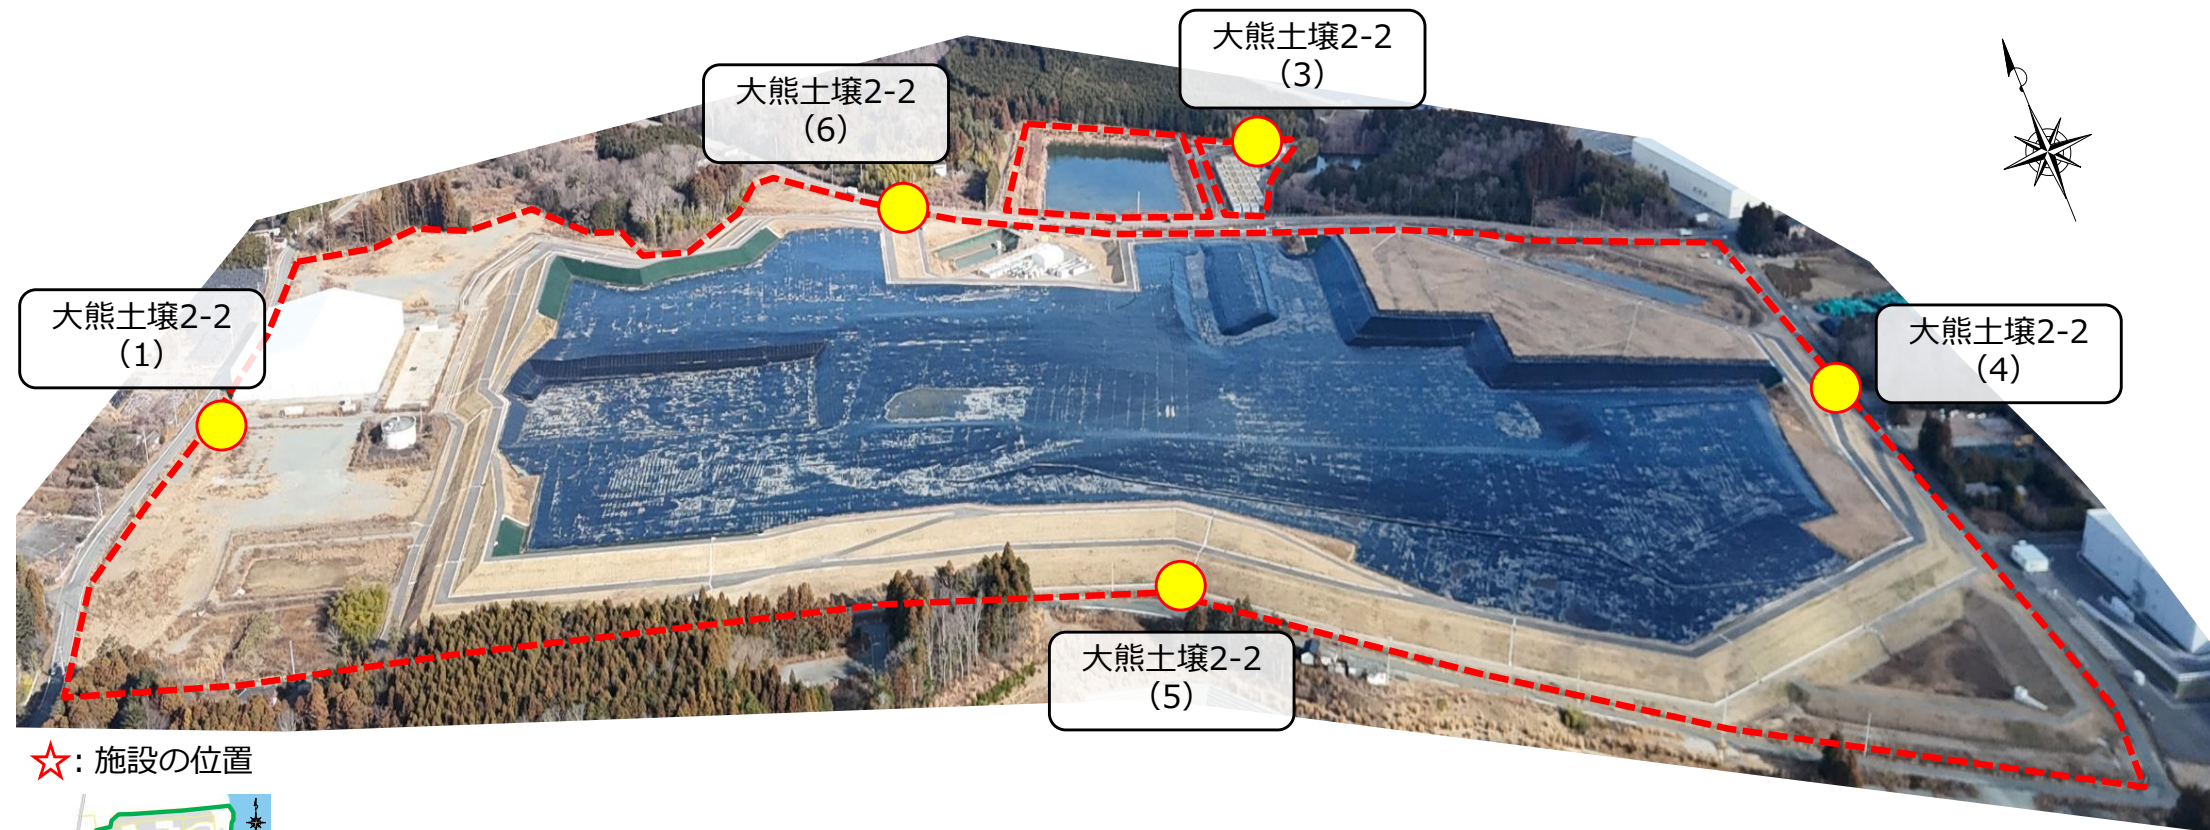

【 凡例 】

● : 空間線量率測定地点

土壌貯蔵施設(大熊②工区)における
空間線量率の測定結果(月次測定)

＜空間線量率＞


 $[\mu \text{ Sv/h}]$

日付 \ 地点	大熊土壤2-2(1)	大熊土壤2-2(3)	大熊土壤2-2(4)	大熊土壤2-2(5)	大熊土壤2-2(6)
(工事前 2017年9月5日)	11.0 (2017年11月10日)	21.6 (2018年2月26日)	17.0 (2017年11月10日)	14.3	16.9 (2017年11月10日)
(貯蔵前 2018年7月11日)	1.78	2.76	3.51	6.43	1.81 (2019年8月16日)
2026年7月7日	0.71	1.43	0.73	5.12	0.95

凡例 工事前：施設造成工事開始前 貯蔵前：施設完成後、分別土壌搬入前

土壌貯蔵施設（大熊②工区）における 周辺環境及び作業環境測定地点（月次測定）＜貯蔵中＞ ①

4頁参照

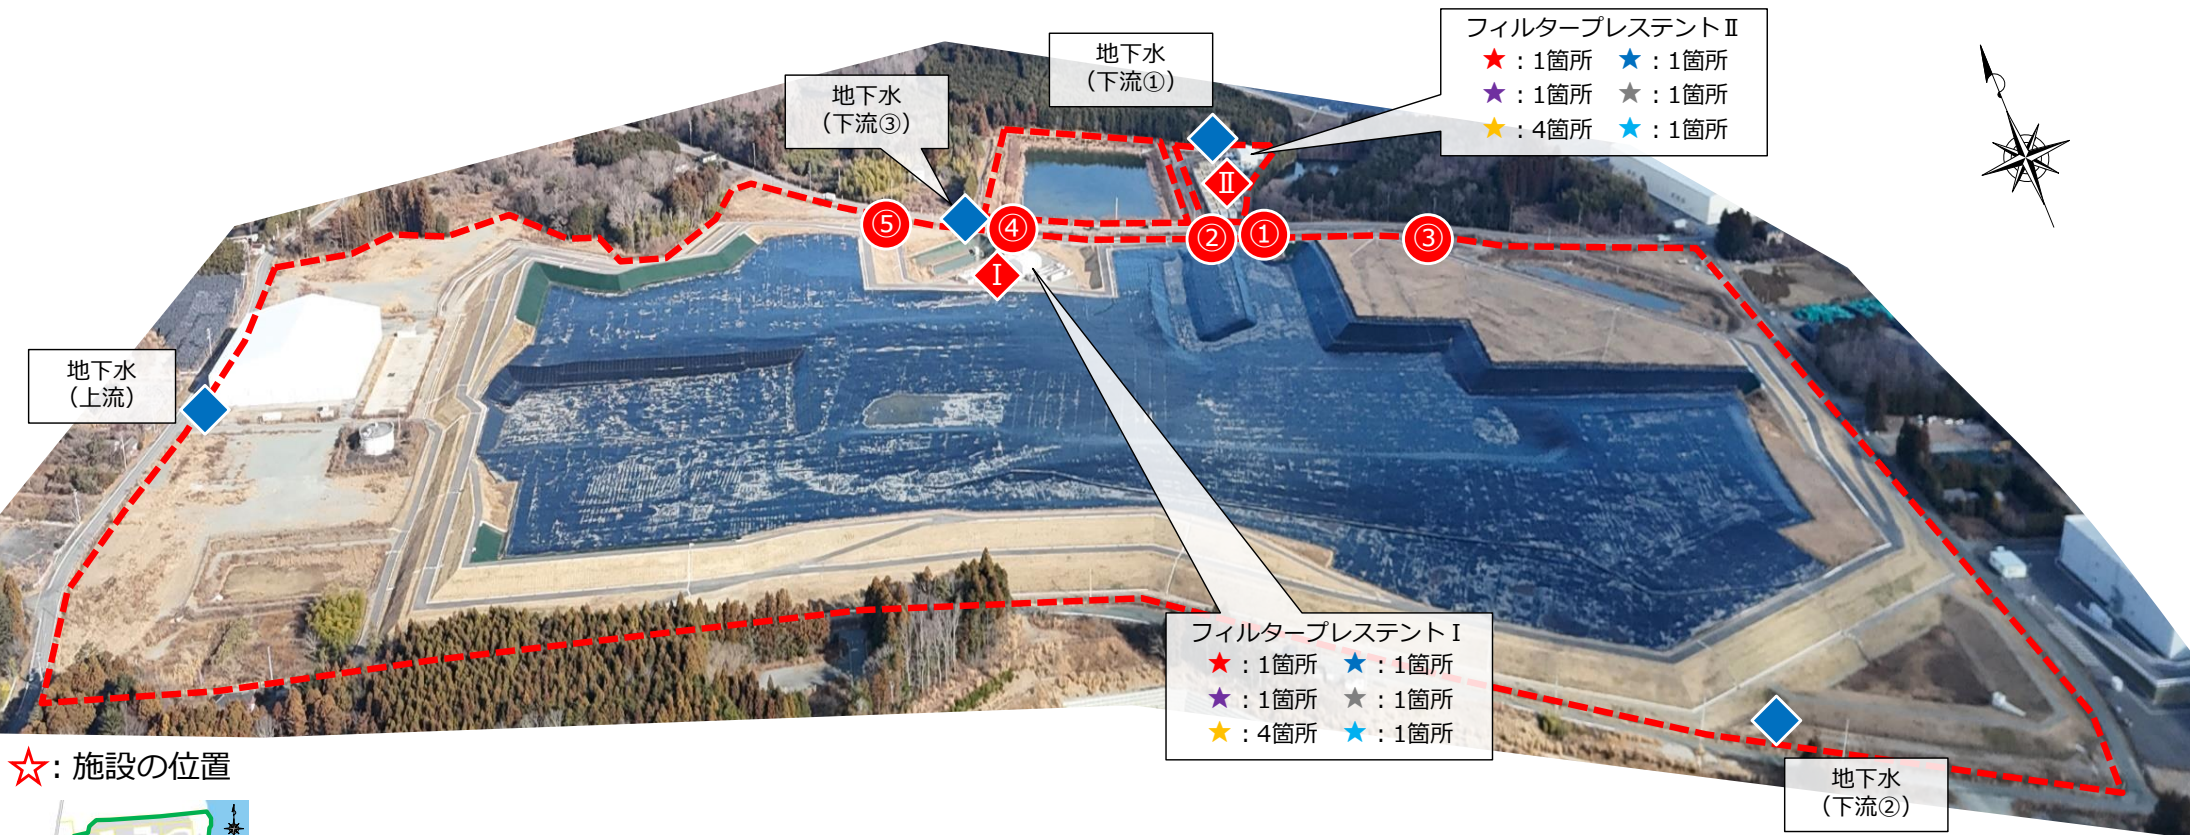


★: 施設の位置



【 凡例 】		
◆ : 地下水（井戸）中の電気伝導率等、放射能濃度	● : 地下水（集排水設備）中の放射能濃度	◆ : 浸出水処理施設放流水の放射能濃度等
■ : 放流先河川の放射能濃度	★ : 粉じん濃度	★ : 空間線量率（作業環境）
★ : 空気中の放射能濃度	★ : 表面汚染密度（床）	★ : 表面汚染密度（壁）
★ : 表面汚染密度（設備）	---	---
	---	---

土壌貯蔵施設（大熊②工区）における 周辺環境及び作業環境測定地点（月次測定）＜貯蔵中＞ ②

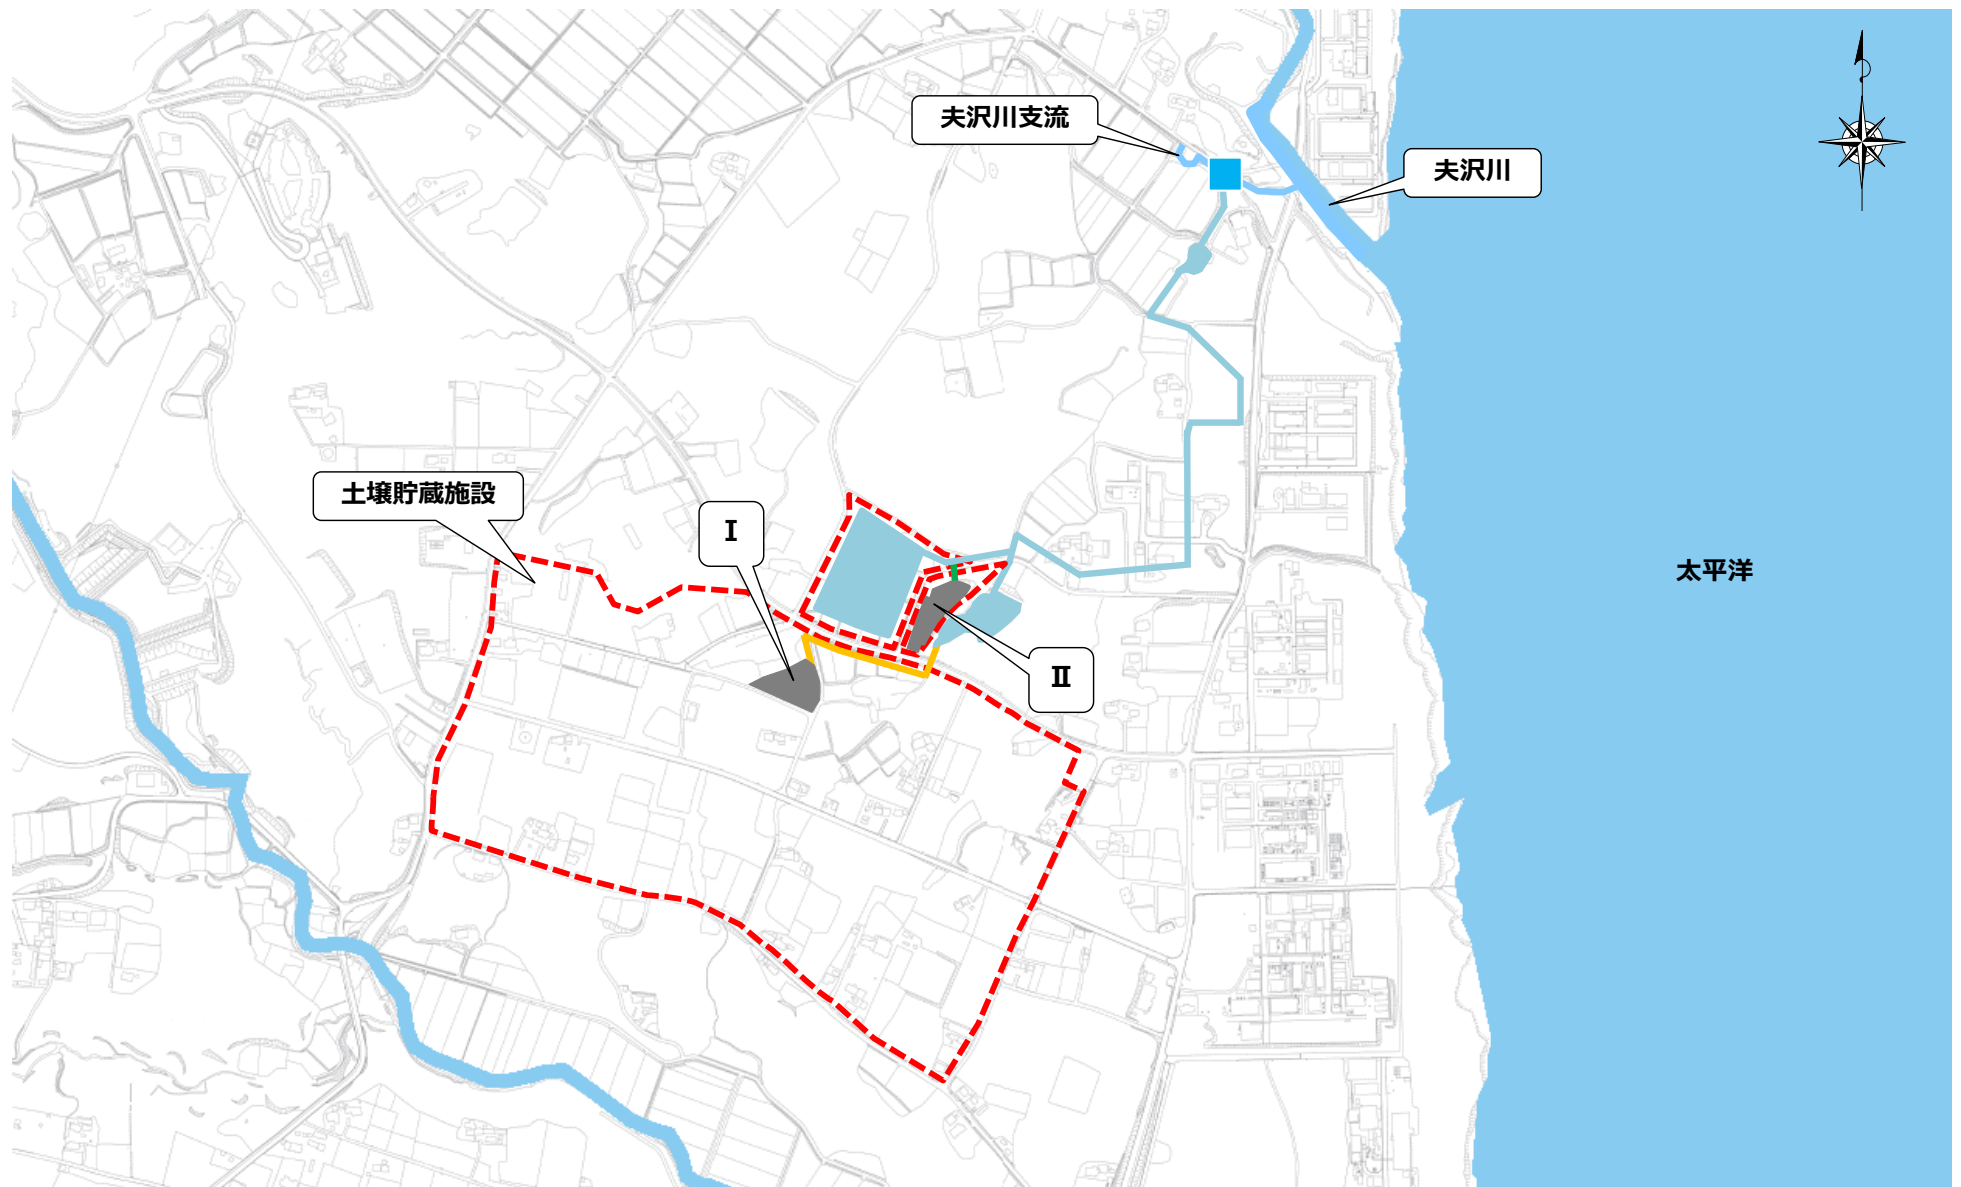

【凡例】

■ : 河川水観測地点

--- : 敷地境界線

— : 放流水の流路（浸出水処理施設 I）

— : 放流水の流路（浸出水処理施設 II）

土壌貯蔵施設（大熊②工区）における 周辺環境及び作業環境測定結果（月次測定）2026年6月

◆地下水（井戸）中の電気伝導率等

測定地点	測定項目		電気伝導率 (mS/m)
	測定日		
上流	2018/7/10	（稼働前）	13
	2026/6/22	（貯蔵中）	12
下流①	2018/7/11	（稼働前）	23
	2026/6/22	（貯蔵中）	28
下流②	2018/7/10	（稼働前）	17
	2026/6/19	（貯蔵中）	13
下流③	2017/10/11	（稼働前）	19
	2026/6/19	（貯蔵中）	53

測定地点	測定項目		塩化物イオン濃度 (mg/L)
	測定日		
上流	2018/7/10	（稼働前）	13
	2026/6/22	（貯蔵中）	8.2
下流①	2018/7/11	（稼働前）	13
	2026/6/22	（貯蔵中）	12
下流②	2018/7/10	（稼働前）	5.7
	2026/6/19	（貯蔵中）	5.1
下流③	2017/10/11	（稼働前）	6.5
	2026/6/19	（貯蔵中）	14

◆地下水（井戸）中の放射能濃度

測定地点	測定項目		Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
	測定日			
上流	2018/7/10	（稼働前）	ND	ND
	2026/6/22	（貯蔵中）	ND	ND
下流①	2018/7/11	（稼働前）	ND	ND
	2026/6/22	（貯蔵中）	ND	ND
下流②	2018/7/10	（稼働前）	ND	ND
	2026/6/19	（貯蔵中）	ND	ND
下流③	2017/10/11	（稼働前）	ND	ND
	2026/6/19	（貯蔵中）	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

●地下水（集排水設備）中の放射能濃度

測定地点	測定項目		Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
	測定日			
集排水設備①	2018/7/5	（稼働前）	ND	ND
	2026/6/16	（貯蔵中）	ND	ND
集排水設備②	2018/10/15	（稼働前）	ND	ND
	2026/6/16	（貯蔵中）	ND	ND
集排水設備③	2019/6/26	（稼働前）	ND	ND
	2026/6/16	（貯蔵中）	ND	ND
集排水設備④	2017/10/5	（稼働前）	ND	ND
	2026/6/16	（貯蔵中）	ND	ND
集排水設備⑤	2020/5/28	（稼働前）	ND	ND
	2026/6/16	（貯蔵中）	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

◆浸出水処理施設放流水の環境項目

測定地点	測定項目		水素イオン濃度 (pH)	生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/L)	化学的酸素要求量 (COD) (mg/L)	浮遊物質量 (SS) (mg/L)
	測定日					
処理水Ⅰ	2026/6/2		7.9	1.3	12	ND
処理水Ⅱ	2026/6/3		8.0	1.5	15	ND

pH基準：5.8～8.6，BOD基準：60mg/L，COD管理値：90mg/L，SS基準：60mg/L

浮遊物質量（SS）のNDとは、報告下限値（1mg/L）未満であることを示す。

◆浸出水処理施設放流水の放射能濃度（週次測定）

測定地点	測定項目		Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
	測定日			
処理水Ⅰ	2026/6/2		ND	ND
	2026/6/10		ND	ND
	2026/6/18		ND	ND
	2026/6/25		ND	ND
処理水Ⅱ	2026/6/3		ND	ND
	2026/6/15		ND	ND
	2026/6/30		ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

※放流水の放射能濃度測定(週次測定)は、浸出水処理を行った週に実施。

◆浸出水処理施設放流水の自動測定結果

測定地点	放流日	放流 回数	濁度		放射性セシウム (Bq/L)	放流量 (m³)
			最小値	最大値		
処理水Ⅰ	2026/6/2 ～2026/6/25	17	0.1	0.8	ND	510
処理水Ⅱ	2026/6/3 ～2026/6/30	38	0.1	0.9	ND	1158.3

濁度管理値：5以下

放射性セシウム管理値：ND

NDとは、検出下限値（5.85Bq/L）未満であることを示す。

■放流先河川の放射能濃度

測定項目		Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
測定日			
2018/7/10	（稼働前）	ND	5.0
2026/6/19	（貯蔵中）	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

放射能濃度〔Bq/L〕の基準：セシウム134の濃度/60＋セシウム137の濃度/90≦1

★粉じん濃度

測定地点	測定項目		粉じん濃度 (mg/m³)
	測定日		
フィルタープレセントⅠ	2026/6/5	（貯蔵中）	3.2
フィルタープレセントⅡ	2026/6/5	（貯蔵中）	5.2

定量下限値：0.1mg/m³、高濃度粉じんの下限値：10mg/m³

★空間線量率（作業環境）

測定地点	測定項目		空間線量率 (μSv/h)
	測定日		
フィルタープレセントⅠ	2026/6/5	（貯蔵中）	0.13
フィルタープレセントⅡ	2026/6/5	（貯蔵中）	0.52

★空気中の放射能濃度

測定地点	測定項目		Cs-134 (Bq/cm³)	Cs-137 (Bq/cm³)
	測定日			
フィルタープレセントⅠ	2026/6/5	（貯蔵中）	ND	ND
フィルタープレセントⅡ	2026/6/5	（貯蔵中）	ND	ND

放射能濃度検出下限値：セシウム134：1.0 ×10⁻⁷Bq/cm³、セシウム137：1.0 ×10⁻⁷Bq/cm³

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

放射能濃度[Bq/cm³]の限度：セシウム134の濃度／2×10⁻³＋セシウム137の濃度／3×10⁻³≦1

表面汚染密度（★床、★壁、★設備）

測定地点			測定日	測定項目	表面汚染密度 (Bq/cm ²)
フィルタープレセントⅠ	床	Ⅰ-①	2026/6/5	(貯蔵中)	ND
	壁	Ⅰ-①	2026/6/5	(貯蔵中)	ND
		Ⅰ-②	2026/6/5	(貯蔵中)	ND
		Ⅰ-③	2026/6/5	(貯蔵中)	ND
		Ⅰ-④	2026/6/5	(貯蔵中)	ND
	設備	フィルタープレスⅠ	2026/6/5	(貯蔵中)	ND
フィルタープレセントⅡ	床	①	2026/6/5	(貯蔵中)	ND
	壁	①	2026/6/5	(貯蔵中)	ND
		②	2026/6/5	(貯蔵中)	ND
		③	2026/6/5	(貯蔵中)	ND
		④	2026/6/5	(貯蔵中)	ND
	設備	フィルタープレスⅡ	2026/6/5	(貯蔵中)	ND

表面汚染密度検出下限値：0.30 Bq/cm²

NDとは、表面汚染密度が検出下限値未満であることを示す。

限度：40Bq/cm²

※2025年4月以降、下記の土壌貯蔵施設の浸出水処理施設が稼働停止中のため、

浸出水処理は本工区の浸出水処理施設において実施。

- ・大熊①工区
- ・大熊③工区
- ・双葉②工区

土壌貯蔵施設（大熊②工区）における 周辺環境及び作業環境測定結果（月次測定）2026年5月

◆地下水（井戸）中の電気伝導率等

測定地点	測定日	測定項目	電気伝導率 (mS/m)
上流	2018/7/10	（稼働前）	13
	2026/5/7	（貯蔵中）	13
下流①	2018/7/11	（稼働前）	23
	2026/5/7	（貯蔵中）	26
下流②	2018/7/10	（稼働前）	17
	2026/5/7	（貯蔵中）	17
下流③	2017/10/11	（稼働前）	19
	2026/5/7	（貯蔵中）	46

測定地点	測定日	測定項目	塩化物イオン濃度 (mg/L)
上流	2018/7/10	（稼働前）	13
	2026/5/7	（貯蔵中）	15
下流①	2018/7/11	（稼働前）	13
	2026/5/7	（貯蔵中）	16
下流②	2018/7/10	（稼働前）	5.7
	2026/5/7	（貯蔵中）	8.5
下流③	2017/10/11	（稼働前）	6.5
	2026/5/7	（貯蔵中）	25

◆地下水（井戸）中の放射能濃度

測定地点	測定日	測定項目	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
上流	2018/7/10	（稼働前）	ND	ND
	2026/5/7	（貯蔵中）	ND	ND
下流①	2018/7/11	（稼働前）	ND	ND
	2026/5/7	（貯蔵中）	ND	ND
下流②	2018/7/10	（稼働前）	ND	ND
	2026/5/7	（貯蔵中）	ND	ND
下流③	2017/10/11	（稼働前）	ND	ND
	2026/5/7	（貯蔵中）	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

●地下水（集排水設備）中の放射能濃度

測定地点	測定日	測定項目	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
集排水設備①	2018/7/5	（稼働前）	ND	ND
	2026/5/26	（貯蔵中）	ND	ND
集排水設備②	2018/10/15	（稼働前）	ND	ND
	2026/5/26	（貯蔵中）	ND	ND
集排水設備③	2019/6/26	（稼働前）	ND	ND
	2026/5/26	（貯蔵中）	ND	ND
集排水設備④	2017/10/5	（稼働前）	ND	ND
	2026/5/26	（貯蔵中）	ND	ND
集排水設備⑤	2020/5/28	（稼働前）	ND	ND
	2026/5/26	（貯蔵中）	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

◆浸出水処理施設放流水の環境項目

測定地点	測定日	水素イオン濃度 (pH)	生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/L)	化学的酸素要求量 (COD) (mg/L)	浮遊物質量 (SS) (mg/L)
処理水Ⅰ	2026/5/12	8.0	2.1	17	ND
処理水Ⅱ	2026/5/11	8.1	2.6	18	ND

pH基準：5.8～8.6，BOD基準：60mg/L，COD管理値：90mg/L，SS基準：60mg/L

浮遊物質量（SS）のNDとは、報告下限値（1mg/L）未満であることを示す。

◆浸出水処理施設放流水の放射能濃度（週次測定）

測定地点	測定日	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
処理水Ⅰ	2026/5/8	ND	ND
	2026/5/12	ND	ND
処理水Ⅱ	2026/5/11	ND	ND
	2026/5/18	ND	ND
	2026/5/26	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

※放流水の放射能濃度測定(週次測定)は、浸出水処理を行った週に実施。

◆浸出水処理施設放流水の自動測定結果

測定地点	放流日	放流 回数	濁度		放射性セシウム (Bq/L)	放流量 (m ³)
			最小値	最大値		
処理水Ⅰ	2026/5/8 ～2026/5/12	8	0.1	0.6	ND	240
処理水Ⅱ	2026/5/11 ～2026/5/28	52	0.1	1.4	ND	1603.1

濁度管理値：5以下

放射性セシウム管理値：ND

NDとは、検出下限値（5.85Bq/L）未満であることを示す。

■放流先河川の放射能濃度

測定日	測定項目	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
2018/7/10	（稼働前）	ND	5.0
2026/5/7	（貯蔵中）	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

放射能濃度〔Bq/L〕の基準：セシウム134の濃度/60＋セシウム137の濃度/90≦1

★粉じん濃度

測定地点	測定日	測定項目	粉じん濃度 (mg/m ³)
フィルタープレセントⅠ	2026/5/15	（貯蔵中）	2.1
フィルタープレセントⅡ	2026/5/15	（貯蔵中）	2.5

定量下限値：0.1mg/m³、高濃度粉じんの下限値：10mg/m³

★空間線量率（作業環境）

測定地点	測定日	測定項目	空間線量率 (μSv/h)
フィルタープレセントⅠ	2026/5/15	（貯蔵中）	0.14
フィルタープレセントⅡ	2026/5/15	（貯蔵中）	0.55

★空気中の放射能濃度

測定地点	測定日	測定項目	Cs-134 (Bq/cm ³)	Cs-137 (Bq/cm ³)
フィルタープレセントⅠ	2026/5/15	（貯蔵中）	ND	ND
フィルタープレセントⅡ	2026/5/15	（貯蔵中）	ND	ND

放射能濃度検出下限値：セシウム134：1.0 ×10⁻⁷Bq/cm³、セシウム137：1.0 ×10⁻⁷Bq/cm³

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

放射能濃度[Bq/cm³]の限度：セシウム134の濃度／2×10⁻³＋セシウム137の濃度／3×10⁻³≦1

表面汚染密度（★床、★壁、★設備）

測定地点			測定日	測定項目	表面汚染密度 (Bq/cm ²)
フィルタープレセントⅠ	床	I-①	2026/5/15	（貯蔵中）	ND
	壁	I-①	2026/5/15	（貯蔵中）	ND
		I-②	2026/5/15	（貯蔵中）	ND
		I-③	2026/5/15	（貯蔵中）	ND
		I-④	2026/5/15	（貯蔵中）	ND
フィルタープレセントⅡ	設備	フィルタープレスⅠ	2026/5/15	（貯蔵中）	ND
	床	①	2026/5/15	（貯蔵中）	ND
		②	2026/5/15	（貯蔵中）	ND
		③	2026/5/15	（貯蔵中）	ND
		④	2026/5/15	（貯蔵中）	ND
	設備	フィルタープレスⅡ	2026/5/15	（貯蔵中）	ND

表面汚染密度検出下限値：0.29 Bq/cm²

NDとは、表面汚染密度が検出下限値未満であることを示す。

限度：40Bq/cm²

※2025年4月以降、下記の土壌貯蔵施設の浸出水処理施設が稼働停止中のため、

浸出水処理は本工区の浸出水処理施設において実施。

- ・大熊①工区
- ・大熊③工区
- ・双葉②工区

土壌貯蔵施設（大熊②工区）における 周辺環境及び作業環境測定結果（月次測定）2026年4月

◆地下水（井戸）中の電気伝導率等

測定地点	測定項目		電気伝導率 (mS/m)
	測定日		
上流	2018/7/10	（稼働前）	13
	2026/4/3	（貯蔵中）	11
下流①	2018/7/11	（稼働前）	23
	2026/4/3	（貯蔵中）	19
下流②	2018/7/10	（稼働前）	17
	2026/4/3	（貯蔵中）	22
下流③	2017/10/11	（稼働前）	19
	2026/4/3	（貯蔵中）	41

測定地点	測定項目		塩化物イオン濃度 (mg/L)
	測定日		
上流	2018/7/10	（稼働前）	13
	2026/4/3	（貯蔵中）	11
下流①	2018/7/11	（稼働前）	13
	2026/4/3	（貯蔵中）	9.4
下流②	2018/7/10	（稼働前）	5.7
	2026/4/3	（貯蔵中）	6.3
下流③	2017/10/11	（稼働前）	6.5
	2026/4/3	（貯蔵中）	17

◆地下水（井戸）中の放射能濃度

測定地点	測定項目		Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
	測定日			
上流	2018/7/10	（稼働前）	ND	ND
	2026/4/3	（貯蔵中）	ND	ND
下流①	2018/7/11	（稼働前）	ND	ND
	2026/4/3	（貯蔵中）	ND	ND
下流②	2018/7/10	（稼働前）	ND	ND
	2026/4/3	（貯蔵中）	ND	ND
下流③	2017/10/11	（稼働前）	ND	ND
	2026/4/3	（貯蔵中）	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

●地下水（集排水設備）中の放射能濃度

測定地点	測定項目		Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
	測定日			
集排水設備①	2018/7/5	（稼働前）	ND	ND
	2026/4/22	（貯蔵中）	ND	ND
集排水設備②	2018/10/15	（稼働前）	ND	ND
	2026/4/22	（貯蔵中）	ND	ND
集排水設備③	2019/6/26	（稼働前）	ND	ND
	2026/4/22	（貯蔵中）	ND	ND
集排水設備④	2017/10/5	（稼働前）	ND	ND
	2026/4/22	（貯蔵中）	ND	ND
集排水設備⑤	2020/5/28	（稼働前）	ND	ND
	2026/4/22	（貯蔵中）	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

◆浸出水処理施設放流水の環境項目

測定地点	測定項目		水素イオン濃度 (pH)	生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/L)	化学的酸素要求量 (COD) (mg/L)	浮遊物質量 (SS) (mg/L)
	測定日					
処理水Ⅰ	2026/4/8		8.3	1.4	10	ND
処理水Ⅱ	2026/4/7		8.1	1.6	20	ND

pH基準：5.8～8.6，BOD基準：60mg/L，COD管理値：90mg/L，SS基準：60mg/L

浮遊物質量（SS）のNDとは、報告下限値（1mg/L）未満であることを示す。

◆浸出水処理施設放流水の放射能濃度（週次測定）

測定地点	測定項目		Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
	測定日			
処理水Ⅰ	2026/4/8		ND	ND
	2026/4/27		ND	ND
処理水Ⅱ	2026/4/1		ND	ND
	2026/4/7		ND	ND
	2026/4/13		ND	ND
	2026/4/20		ND	ND
	2026/4/28		ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

※放流水の放射能濃度測定(週次測定)は、浸出水処理を行った週に実施。

◆浸出水処理施設放流水の自動測定結果

測定地点	放流日	放流 回数	濁度		放射性セシウム (Bq/L)	放流量 (m³)
			最小値	最大値		
処理水Ⅰ	2026/4/8 ～2026/4/27	12	0.1	0.6	ND	360
処理水Ⅱ	2026/4/1 ～2026/4/28	68	0.1	0.5	ND	2089.3

濁度管理値：5以下

放射性セシウム管理値：ND

NDとは、検出下限値（5.85Bq/L）未満であることを示す。

■放流先河川の放射能濃度

測定項目		Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
測定日			
2018/7/10	（稼働前）	ND	5.0
2026/4/3	（貯蔵中）	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

放射能濃度〔Bq/L〕の基準：セシウム134の濃度/60＋セシウム137の濃度/90≦1

★粉じん濃度

測定地点	測定項目		粉じん濃度 (mg/m³)
	測定日		
フィルタープレセントⅠ	2026/4/9	（貯蔵中）	2.0
フィルタープレセントⅡ	2026/4/9	（貯蔵中）	1.8

定量下限値：0.1mg/m³、高濃度粉じんの下限値：10mg/m³

★空間線量率（作業環境）

測定地点	測定項目		空間線量率 (μSv/h)
	測定日		
フィルタープレセントⅠ	2026/4/9	（貯蔵中）	0.15
フィルタープレセントⅡ	2026/4/9	（貯蔵中）	0.57

★空気中の放射能濃度

測定地点	測定項目		Cs-134 (Bq/cm³)	Cs-137 (Bq/cm³)
	測定日			
フィルタープレセントⅠ	2026/4/9	（貯蔵中）	ND	ND
フィルタープレセントⅡ	2026/4/9	（貯蔵中）	ND	ND

放射能濃度検出下限値：セシウム134：1.0 ×10⁻⁷Bq/cm³、セシウム137：1.0 ×10⁻⁷Bq/cm³

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

放射能濃度[Bq/cm³]の限度：セシウム134の濃度／2×10⁻³＋セシウム137の濃度／3×10⁻³≦1

表面汚染密度（★床、★壁、★設備）

測定地点			測定日	測定項目	表面汚染密度 (Bq/cm ²)
フィルタープレセントⅠ	床	Ⅰ-①	2026/4/9	(貯蔵中)	ND
	壁	Ⅰ-①	2026/4/9	(貯蔵中)	ND
		Ⅰ-②	2026/4/9	(貯蔵中)	ND
		Ⅰ-③	2026/4/9	(貯蔵中)	ND
		Ⅰ-④	2026/4/9	(貯蔵中)	ND
	設備	フィルタープレスⅠ	2026/4/9	(貯蔵中)	ND
フィルタープレセントⅡ	床	①	2026/4/9	(貯蔵中)	ND
	壁	①	2026/4/9	(貯蔵中)	ND
		②	2026/4/9	(貯蔵中)	ND
		③	2026/4/9	(貯蔵中)	ND
		④	2026/4/9	(貯蔵中)	ND
	設備	フィルタープレスⅡ	2026/4/9	(貯蔵中)	ND

表面汚染密度検出下限値：0.29 Bq/cm²

NDとは、表面汚染密度が検出下限値未満であることを示す。

限度：40Bq/cm²

※2025年4月以降、下記の土壌貯蔵施設の浸出水処理施設が稼働停止中のため、
浸出水処理は本工区の浸出水処理施設において実施。

- ・大熊①工区
- ・大熊③工区
- ・双葉②工区
