


廃棄物貯蔵施設（双葉1工区）における 空間線量率の測定地点（月次測定）＜貯蔵中＞



★：施設の位置

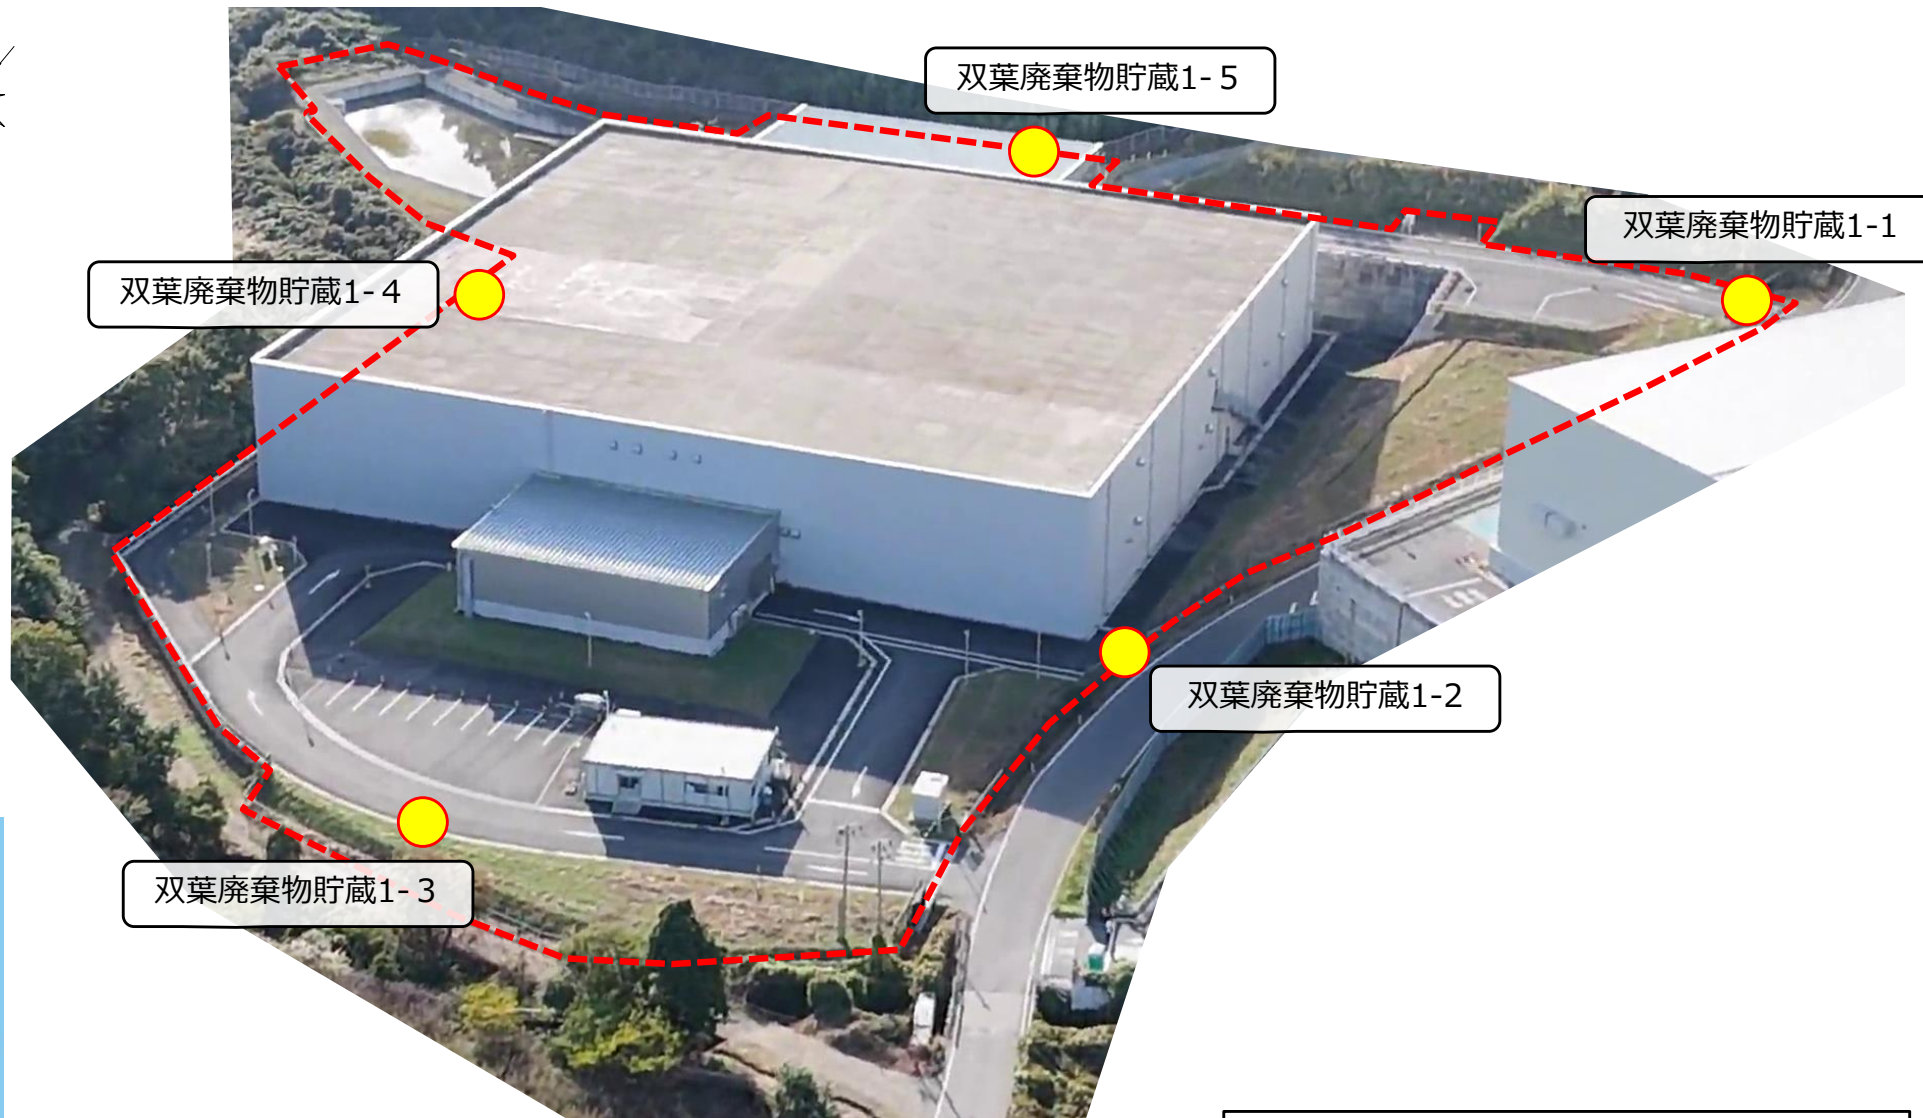

【凡例】

●：空間線量率測定地点

空間線量率のモニタリング結果(月次測定)

【廃棄物貯蔵施設(双葉1工区)】


<空間線量率>

[μ Sv/h]

日付 \ 地点	双葉廃棄物貯蔵 1-1	双葉廃棄物貯蔵 1-2	双葉廃棄物貯蔵 1-3	双葉廃棄物貯蔵 1-4	双葉廃棄物貯蔵 1-5
(工事前 2018年5月16日)	2.15	2.30	3.26	3.81	3.00
(貯蔵前 2020年3月25日)	0.23	0.32	0.73	0.54	0.67
2026年9月10日	0.18	0.26	0.58	0.48	0.47

凡例 工事前:施設造成工事開始前 貯蔵前:施設完成後、貯蔵容器搬入前

廃棄物貯蔵施設（双葉1工区）における 周辺環境及び作業環境測定地点（月次測定）＜貯蔵中＞

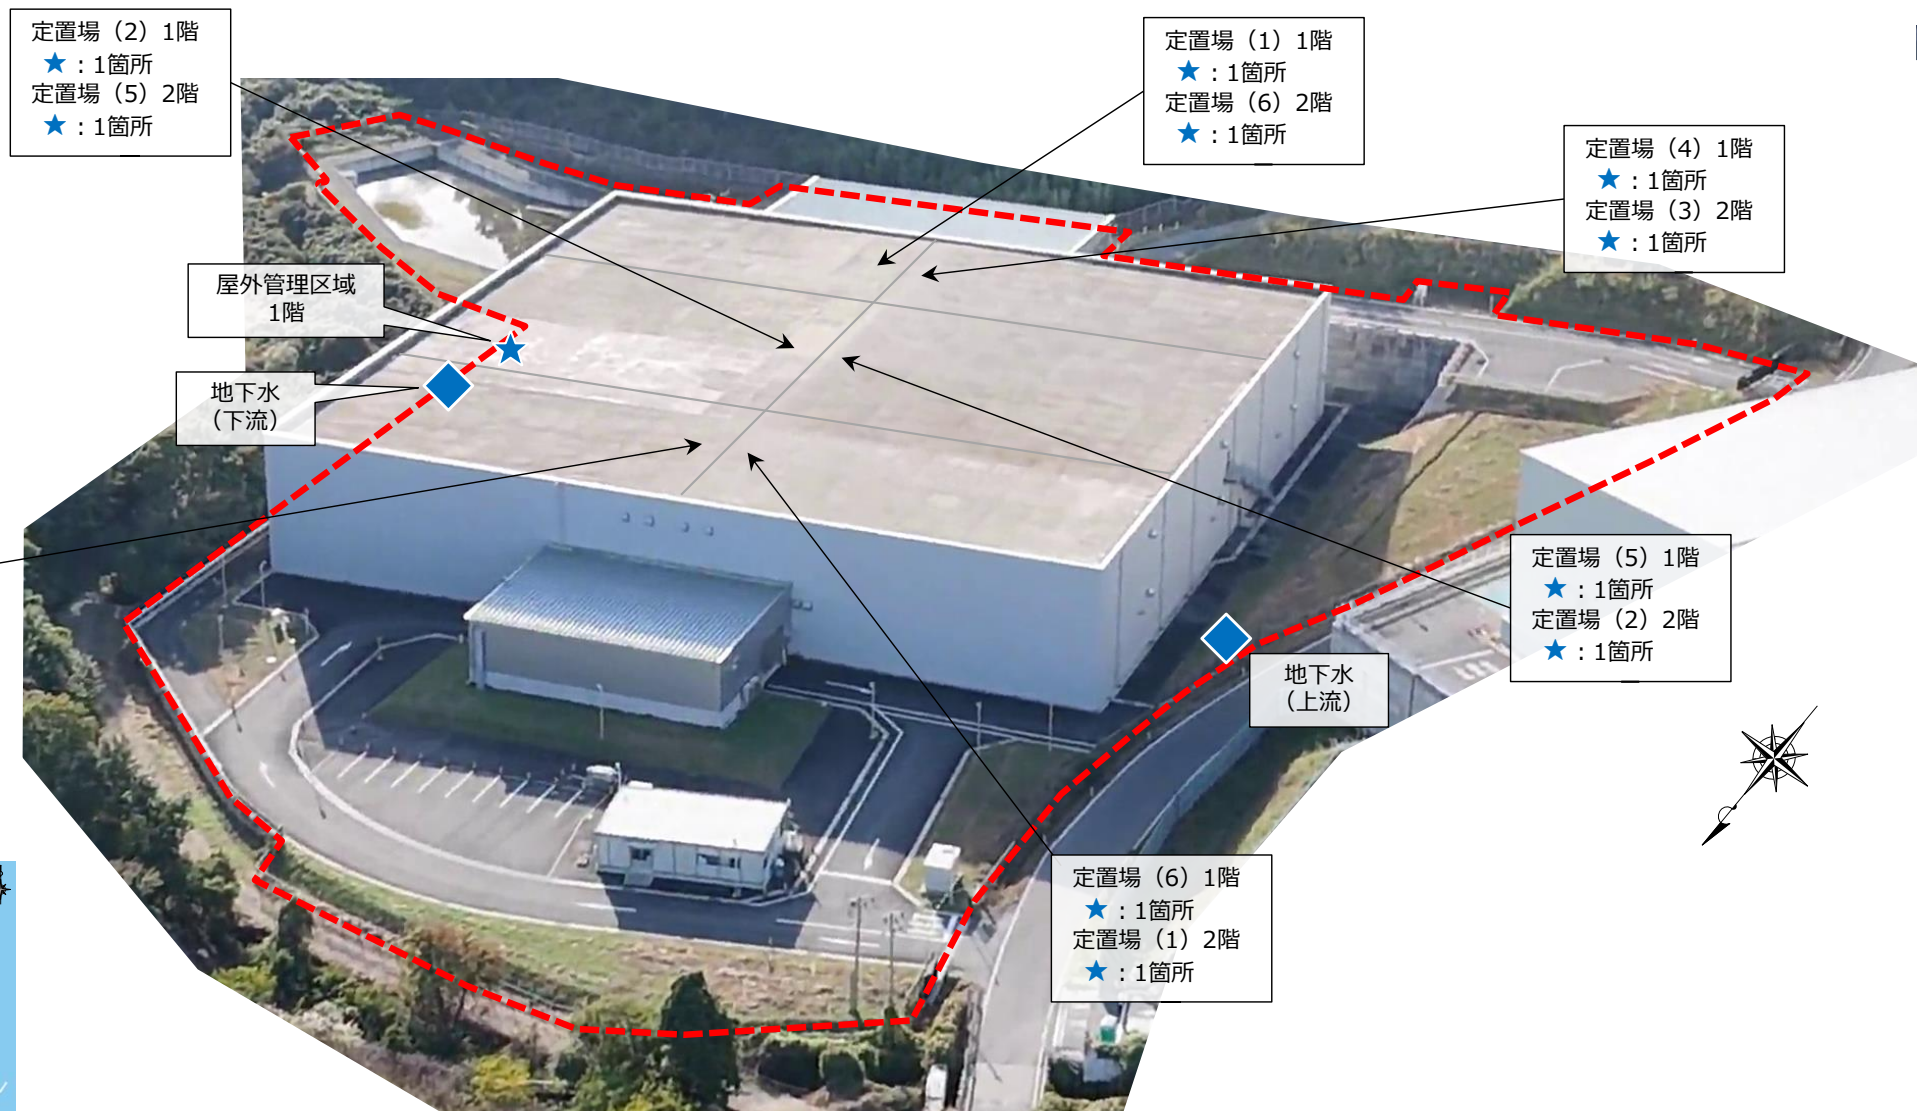

★：施設の位置



【 凡例 】

◆：地下水中の放射能濃度等

★：空間線量率（作業環境）

---：敷地境界線

廃棄物貯蔵施設（双葉1工区）における 周辺環境測定結果（月次測定）2026年7月

◆地下水中の放射能濃度等

測定地点	測定日	測定項目	電気伝導率 (mS/m)
上流	2020/3/2	(稼働前)	16
	2026/7/14	(貯蔵中)	16
下流	2020/3/2	(稼働前)	21
	2026/7/14	(貯蔵中)	24

測定地点	測定日	測定項目	塩化物イオン濃度 (mg/L)
上流	2020/3/2	(稼働前)	7.3
	2026/7/14	(貯蔵中)	7.5
下流	2020/3/2	(稼働前)	12
	2026/7/14	(貯蔵中)	5.0

測定地点	測定日	測定項目	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
上流	2020/3/2	(稼働前)	ND	ND
	2026/7/14	(貯蔵中)	ND	ND
下流	2020/3/2	(稼働前)	ND	ND
	2026/7/14	(貯蔵中)	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

★空間線量率（作業環境）

測定地点	測定日	測定項目	空間線量率 (μ Sv/h)
定置場（1）1階	2026/7/14	(貯蔵中)	3.56
定置場（2）1階	2026/7/14	(貯蔵中)	10.0
定置場（3）1階	2026/7/14	(貯蔵中)	1.60
定置場（4）1階	2026/7/14	(貯蔵中)	6.48
定置場（5）1階	2026/7/14	(貯蔵中)	9.90
定置場（6）1階	2026/7/14	(貯蔵中)	4.00
屋外管理区域 1階	2026/7/14	(貯蔵中)	1.01
定置場（1）2階	2026/7/14	(貯蔵中)	1.93
定置場（2）2階	2026/7/14	(貯蔵中)	2.78
定置場（3）2階	2026/7/14	(貯蔵中)	2.55
定置場（4）2階	2026/7/14	(貯蔵中)	3.81
定置場（5）2階	2026/7/14	(貯蔵中)	1.52
定置場（6）2階	2026/7/14	(貯蔵中)	2.23

廃棄物貯蔵施設（双葉1工区）における 周辺環境測定結果（月次測定）2026年6月

◆地下水中の放射能濃度等

測定地点	測定日 \ 測定項目	電気伝導率 (mS/m)
	測定日	
上流	2020/3/2 (稼働前)	16
	2026/6/16 (貯蔵中)	17
下流	2020/3/2 (稼働前)	21
	2026/6/16 (貯蔵中)	25

測定地点	測定日 \ 測定項目	塩化物イオン濃度 (mg/L)
	測定日	
上流	2020/3/2 (稼働前)	7.3
	2026/6/16 (貯蔵中)	8.4
下流	2020/3/2 (稼働前)	12
	2026/6/16 (貯蔵中)	5.6

測定地点	測定日 \ 測定項目	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
	測定日		
上流	2020/3/2 (稼働前)	ND	ND
	2026/6/16 (貯蔵中)	ND	ND
下流	2020/3/2 (稼働前)	ND	ND
	2026/6/16 (貯蔵中)	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

★空間線量率（作業環境）

測定地点	測定日 \ 測定項目	空間線量率 (μ Sv/h)
	測定日	
定置場（1）1階	2026/6/9 (貯蔵中)	3.71
定置場（2）1階	2026/6/9 (貯蔵中)	10.3
定置場（3）1階	2026/6/9 (貯蔵中)	1.62
定置場（4）1階	2026/6/9 (貯蔵中)	6.56
定置場（5）1階	2026/6/9 (貯蔵中)	10.2
定置場（6）1階	2026/6/9 (貯蔵中)	4.18
屋外管理区域 1階	2026/6/9 (貯蔵中)	1.05
定置場（1）2階	2026/6/9 (貯蔵中)	2.00
定置場（2）2階	2026/6/9 (貯蔵中)	2.87
定置場（3）2階	2026/6/9 (貯蔵中)	2.61
定置場（4）2階	2026/6/9 (貯蔵中)	3.96
定置場（5）2階	2026/6/9 (貯蔵中)	1.57
定置場（6）2階	2026/6/9 (貯蔵中)	2.30

廃棄物貯蔵施設（双葉1工区）における 周辺環境測定結果（月次測定）2026年5月

◆地下水中の放射能濃度等

測定地点	測定項目	電気伝導率 (mS/m)
	測定日	
上流	2020/3/2 (稼働前)	16
	2026/5/19 (貯蔵中)	17
下流	2020/3/2 (稼働前)	21
	2026/5/19 (貯蔵中)	24

測定地点	測定項目	塩化物イオン濃度 (mg/L)
	測定日	
上流	2020/3/2 (稼働前)	7.3
	2026/5/19 (貯蔵中)	2.7
下流	2020/3/2 (稼働前)	12
	2026/5/19 (貯蔵中)	1.9

測定地点	測定項目	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
	測定日		
上流	2020/3/2 (稼働前)	ND	ND
	2026/5/19 (貯蔵中)	ND	ND
下流	2020/3/2 (稼働前)	ND	ND
	2026/5/19 (貯蔵中)	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

★空間線量率（作業環境）

測定地点	測定項目	空間線量率 (μ Sv/h)
	測定日	
定置場（1）1階	2026/5/12 (貯蔵中)	3.60
定置場（2）1階	2026/5/12 (貯蔵中)	9.98
定置場（3）1階	2026/5/12 (貯蔵中)	1.56
定置場（4）1階	2026/5/12 (貯蔵中)	6.48
定置場（5）1階	2026/5/12 (貯蔵中)	10.1
定置場（6）1階	2026/5/12 (貯蔵中)	4.10
屋外管理区域 1階	2026/5/12 (貯蔵中)	1.05
定置場（1）2階	2026/5/12 (貯蔵中)	1.97
定置場（2）2階	2026/5/12 (貯蔵中)	2.85
定置場（3）2階	2026/5/12 (貯蔵中)	2.52
定置場（4）2階	2026/5/12 (貯蔵中)	3.89
定置場（5）2階	2026/5/12 (貯蔵中)	1.54
定置場（6）2階	2026/5/12 (貯蔵中)	2.27

廃棄物貯蔵施設（双葉1工区）における 周辺環境測定結果（月次測定）2026年4月

◆地下水中の放射能濃度等

測定地点	測定項目		電気伝導率 (mS/m)
	測定日		
上流	2020/3/2	(稼働前)	16
	2026/4/14	(貯蔵中)	18
下流	2020/3/2	(稼働前)	21
	2026/4/14	(貯蔵中)	22

測定地点	測定項目		塩化物イオン濃度 (mg/L)
	測定日		
上流	2020/3/2	(稼働前)	7.3
	2026/4/14	(貯蔵中)	5.7
下流	2020/3/2	(稼働前)	12
	2026/4/14	(貯蔵中)	3.7

測定地点	測定項目		Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
	測定日			
上流	2020/3/2	(稼働前)	ND	ND
	2026/4/14	(貯蔵中)	ND	ND
下流	2020/3/2	(稼働前)	ND	ND
	2026/4/14	(貯蔵中)	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

★空間線量率（作業環境）

測定地点	測定項目		空間線量率 (μ Sv/h)
	測定日		
定置場（1）1階	2026/4/14	(貯蔵中)	3.67
定置場（2）1階	2026/4/14	(貯蔵中)	10.1
定置場（3）1階	2026/4/14	(貯蔵中)	1.65
定置場（4）1階	2026/4/14	(貯蔵中)	6.55
定置場（5）1階	2026/4/14	(貯蔵中)	10.1
定置場（6）1階	2026/4/14	(貯蔵中)	4.14
屋外管理区域 1階	2026/4/14	(貯蔵中)	1.07
定置場（1）2階	2026/4/14	(貯蔵中)	2.05
定置場（2）2階	2026/4/14	(貯蔵中)	2.92
定置場（3）2階	2026/4/14	(貯蔵中)	2.65
定置場（4）2階	2026/4/14	(貯蔵中)	4.04
定置場（5）2階	2026/4/14	(貯蔵中)	1.63
定置場（6）2階	2026/4/14	(貯蔵中)	2.31
