コンデンサー解体設備、及び鉄心コイル破砕・分別設備の先行解体撤去の実施状況 (2024年11月時点)

1）工事対象範囲

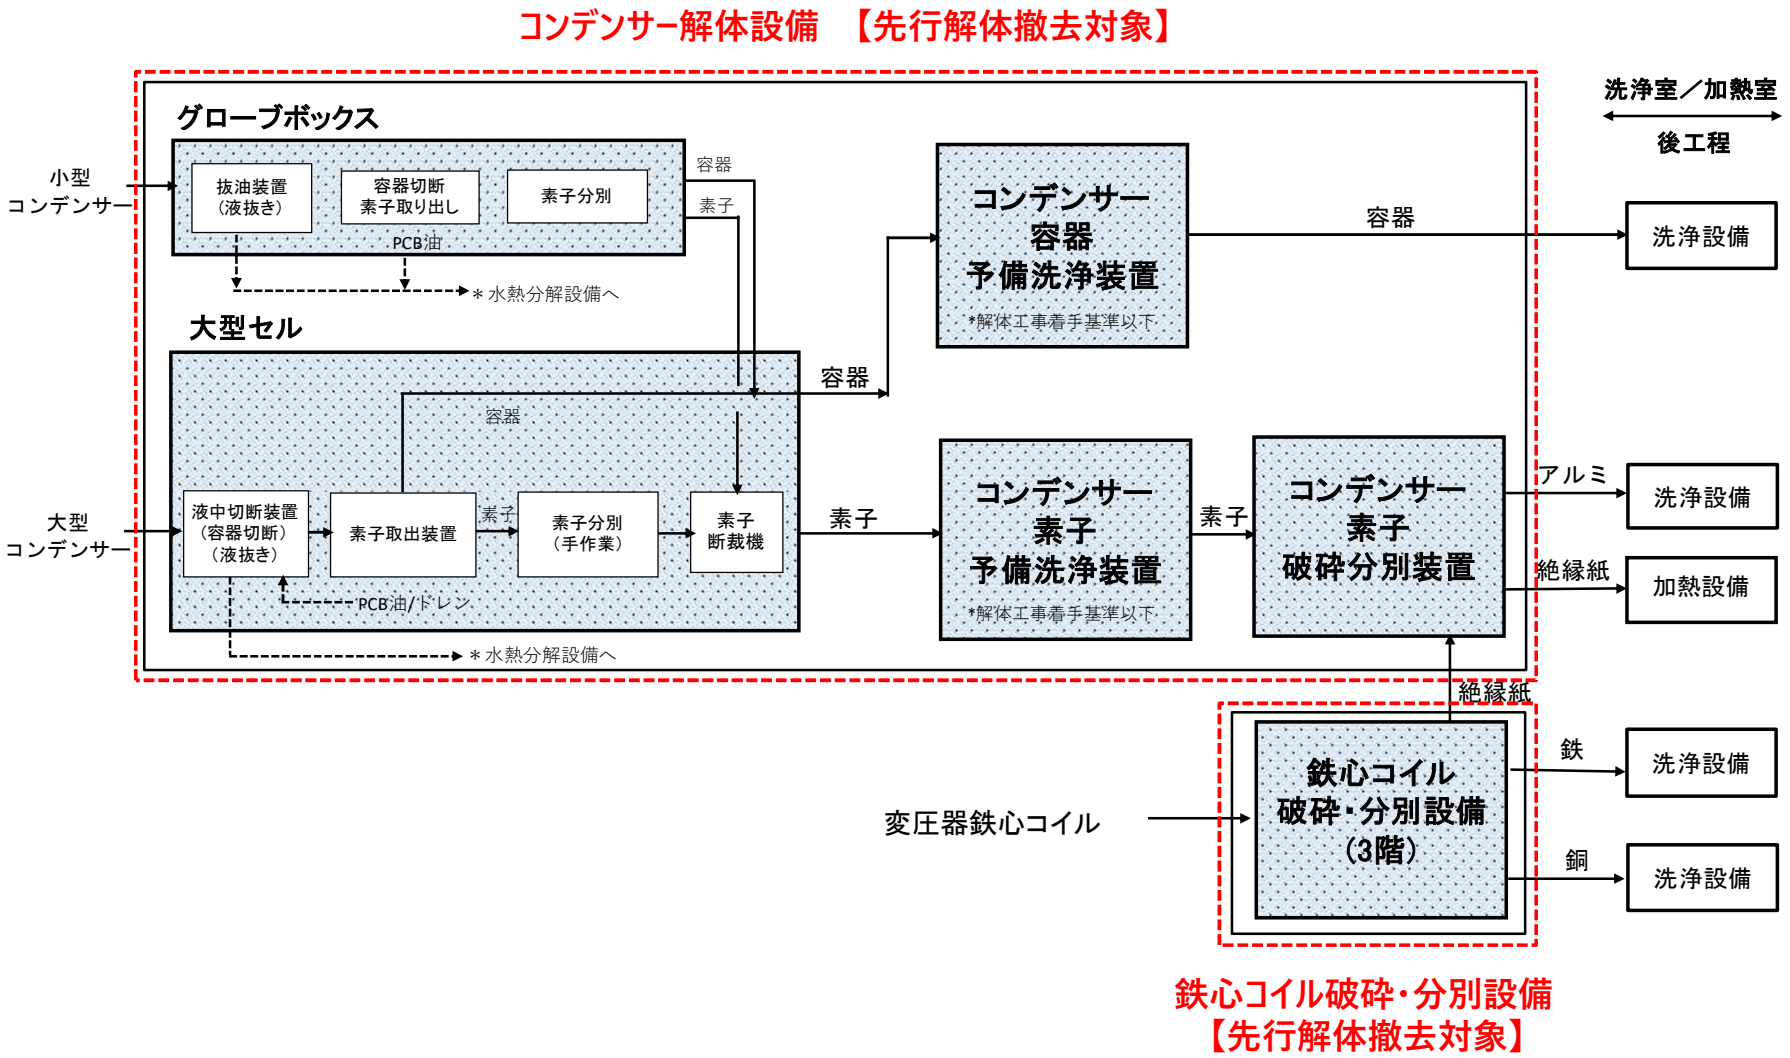

Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

コンデンサー解体設備、及び鉄心コイル破砕・分別設備の先行解体撤去の実施状況 (2024年11月時点)

2）洗浄作業の方法

設備・装置		機器等の外表面	配管・タンク等の内面
コンデンサー解体設備	大型セル	温水＋絶縁油による高圧洗浄	絶縁油による通液洗浄
	グローブボックス	絶縁油によるスプレー洗浄	
	容器予備洗浄装置	洗浄対象外	操業停止時の洗浄運転により、解体工事着手基準以下を確認済み
	素子予備洗浄装置		
	素子破砕分別装置		洗浄対象外 (洗浄対象物 無し)
鉄心コイル破砕・分別設備			

Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.

コンデンサー解体設備、及び鉄心コイル破砕・分別設備の先行解体撤去の実施状況 (2024年11月時点)

3）洗浄作業の状況（大型セル）

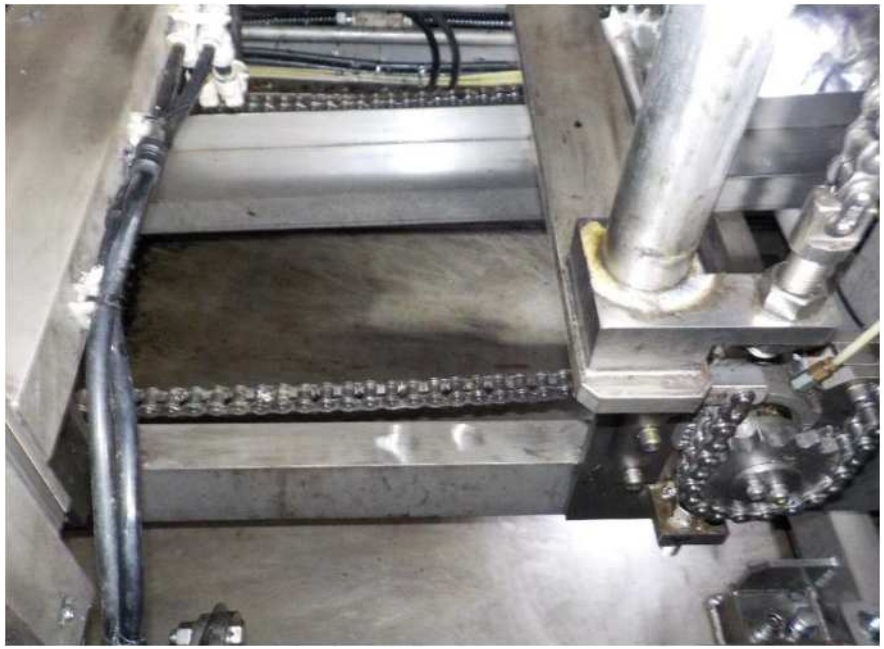

大型セルの内部（清掃後）

大型セル内の機器の洗浄作業の状況

4）今後の予定

・洗浄作業を終了後、2025年1月よりPCB除去分別作業に着手する予定。

Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved.
