
土壌貯蔵施設（双葉②工区）における
空間線量率の測定地点（月次測定）＜貯蔵中＞



☆：施設の位置

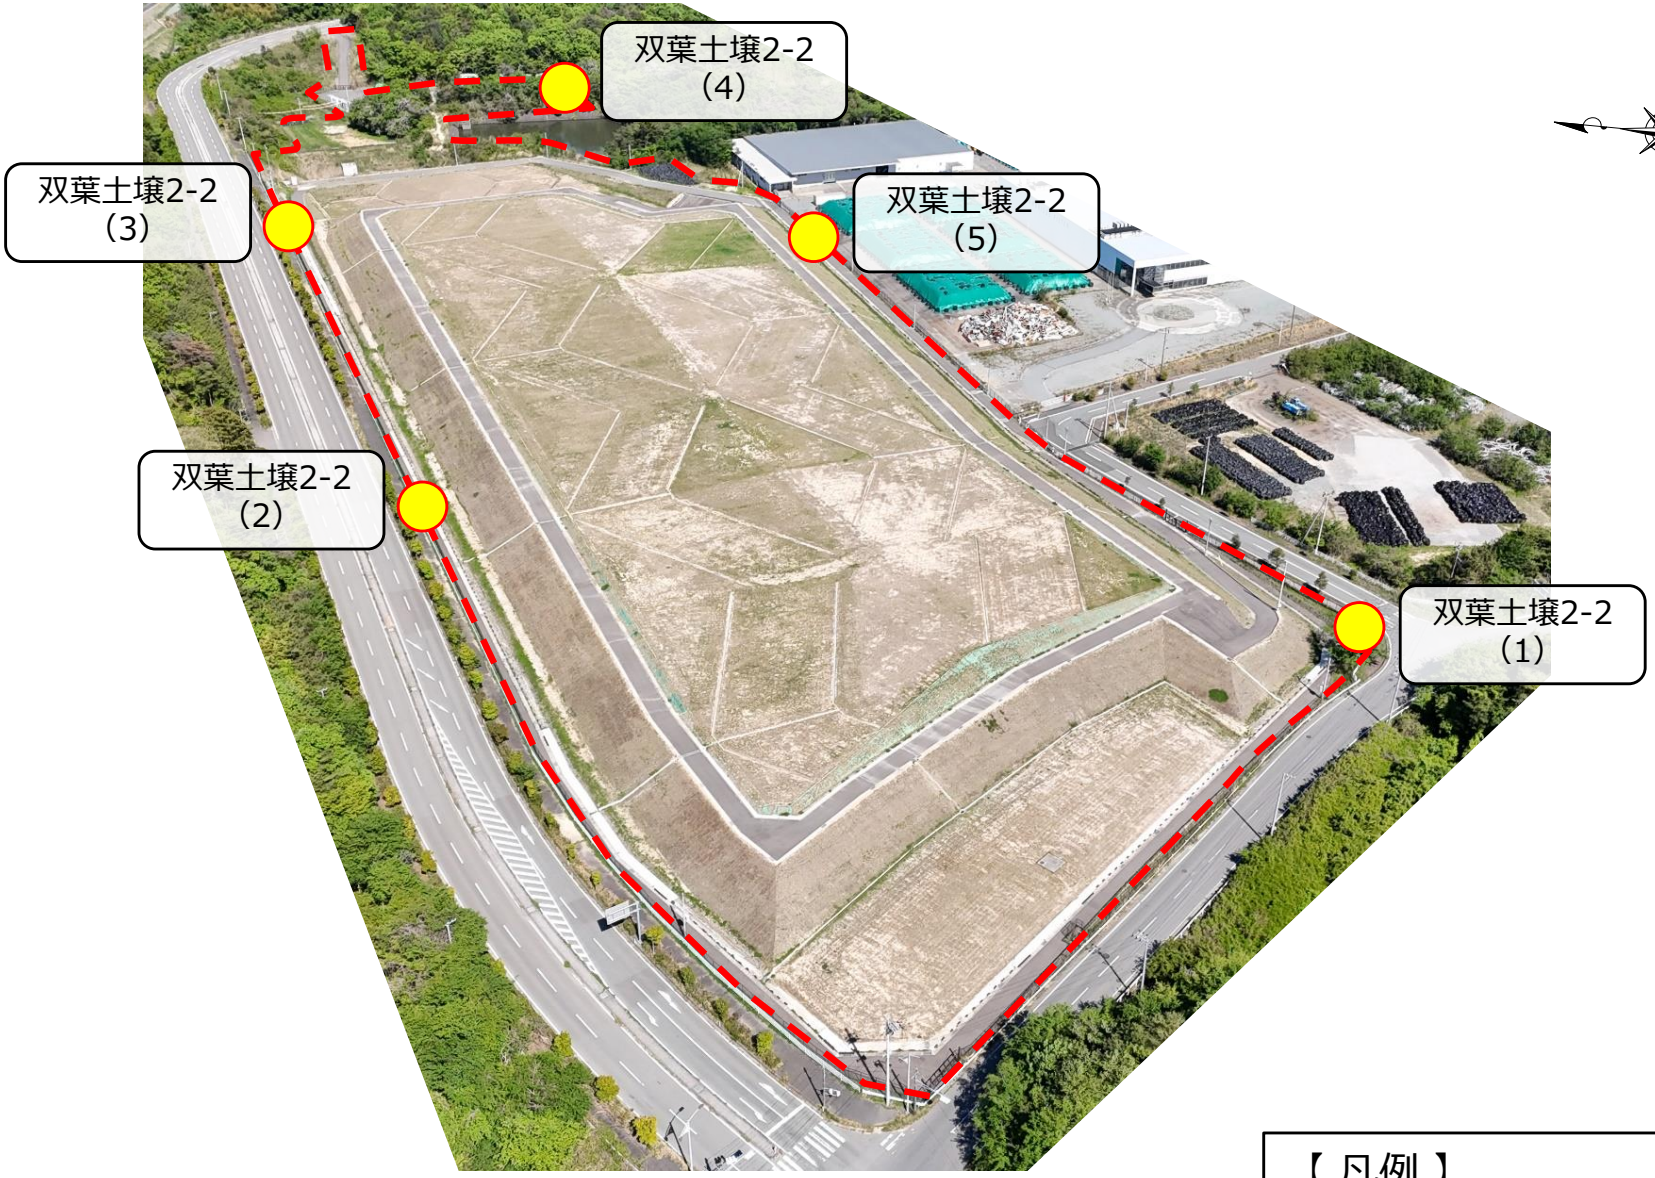

【 凡例 】

● ： 空間線量率測定地点

土壌貯蔵施設（双葉②工区）における
空間線量率の測定結果（月次測定）

＜空間線量率＞


［μSv/h］

地点 / 日付	双葉土壌2-2(1)	双葉土壌2-2(2)	双葉土壌2-2(3)	双葉土壌2-2(4)	双葉土壌2-2(5)
（工事前　2018年3月15日）	2.73	3.20	2.04	2.02	4.53
（貯蔵前　2019年5月13日）	1.91	0.92	1.10	0.96	0.27
2026年10月7日	1.20	0.63	0.61	0.61	0.17

凡例　　工事前：施設造成工事開始前　　貯蔵前：施設完成後、分別土壌搬入前

土壌貯蔵施設（双葉②工区）における
周辺環境測定地点（月次測定）＜貯蔵中＞ ①

4頁参照

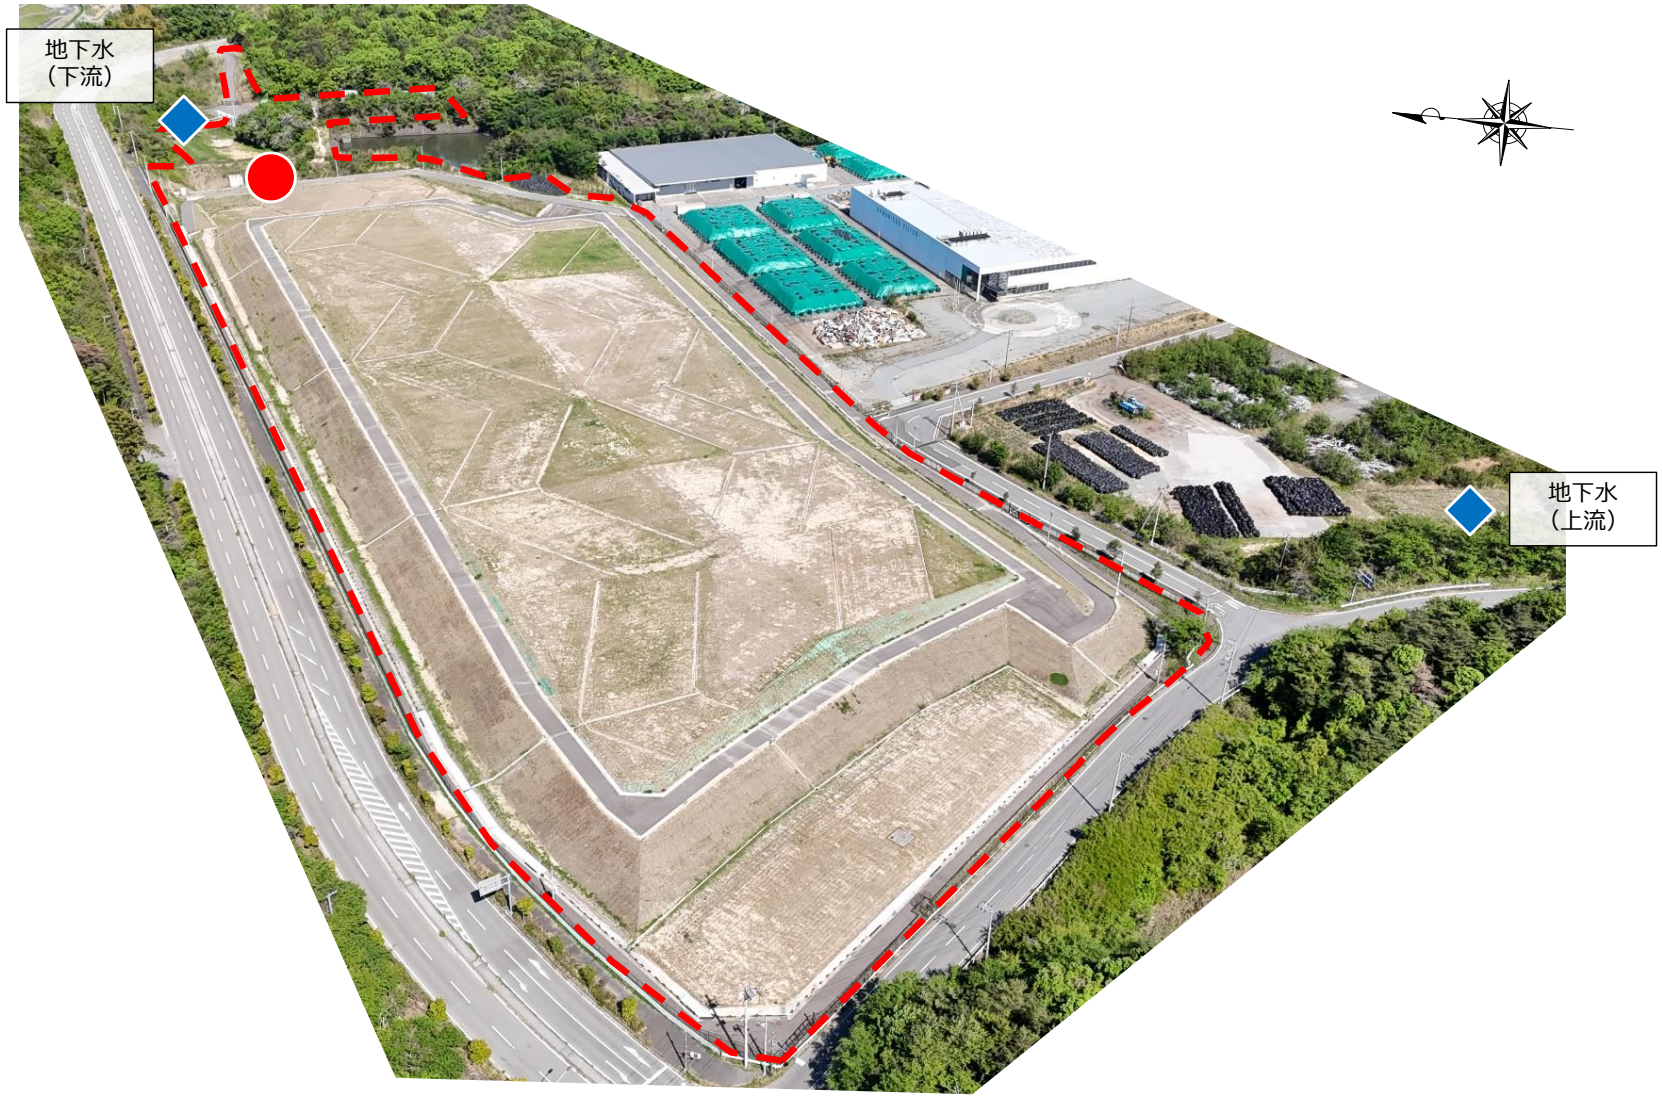


☆：施設の位置



【 凡例 】

- ◆：地下水（井戸）中の電気伝導率等、放射能濃度
- ●：地下水（集排水設備）中の放射能濃度
- ■：放流先河川の放射能濃度
- ---：敷地境界線

土壌貯蔵施設（双葉②工区）における
周辺環境測定地点（月次測定）＜貯蔵中＞ ②

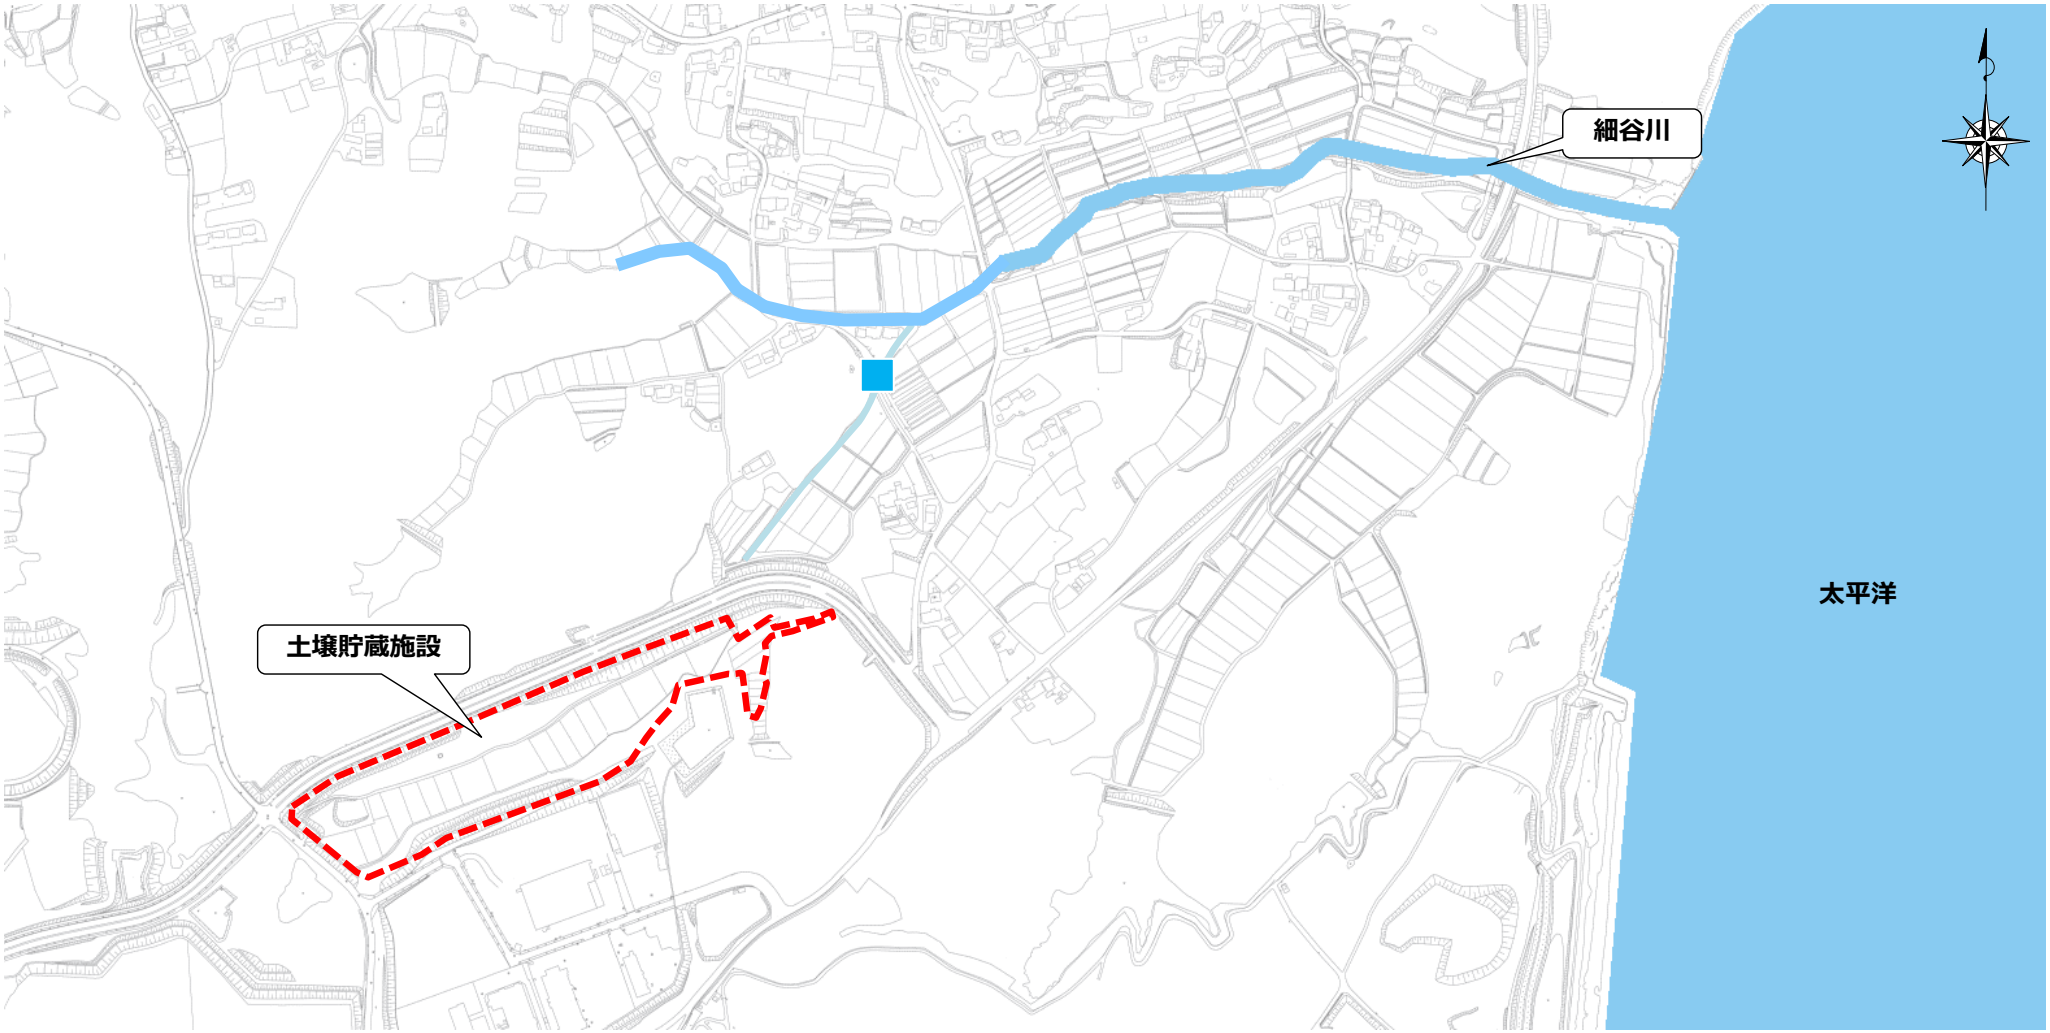

【 凡例 】
■ ：河川水観測地点　　---：敷地境界線

土壌貯蔵施設（双葉②工区）における
周辺環境測定結果（月次測定）2026年9月

◆地下水（井戸）中の電気伝導率等

測定地点	測定日＼測定項目		電気伝導率 (mS/m)
上流	2019/5/8	（稼働前）	61
	2026/9/15	（貯蔵中）	48
下流	2019/5/8	（稼働前）	18
	2026/9/15	（貯蔵中）	26

測定地点	測定日＼測定項目		塩化物イオン濃度 (mg/L)
上流	2019/5/8	（稼働前）	8.0
	2026/9/15	（貯蔵中）	10
下流	2019/5/8	（稼働前）	10
	2026/9/15	（貯蔵中）	13

◆地下水（井戸）中の放射能濃度

測定地点	測定日＼測定項目		Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
上流	2019/5/8	（稼働前）	ND	ND
	2026/9/15	（貯蔵中）	ND	ND
下流	2019/5/8	（稼働前）	ND	ND
	2026/9/15	（貯蔵中）	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

●地下水（集排水設備）中の放射能濃度

測定日＼測定項目		Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
2019/5/21	（稼働前）	ND	ND
2026/9/9	（貯蔵中）	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

■放流先河川の放射能濃度

測定日＼測定項目		Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
2019/4/24	（稼働前）	ND	ND
2026/9/15	（貯蔵中）	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

放射能濃度[Bq/L]の基準：セシウム134の濃度／60＋セシウム137の濃度／90≦1

※本工区の浸出水処理施設は2025年4月以降、稼働停止中。
浸出水処理は土壌貯蔵施設（大熊②工区）の浸出水処理施設において実施。

土壌貯蔵施設（双葉②工区）における
周辺環境測定結果（月次測定）2026年8月

◆地下水（井戸）中の電気伝導率等

測定地点	測定日＼測定項目	電気伝導率 (mS/m)
上流	2019/5/8 （稼働前）	61
	2026/8/21 （貯蔵中）	41
下流	2019/5/8 （稼働前）	18
	2026/8/21 （貯蔵中）	26

測定地点	測定日＼測定項目	塩化物イオン濃度 (mg/L)
上流	2019/5/8 （稼働前）	8.0
	2026/8/21 （貯蔵中）	7.1
下流	2019/5/8 （稼働前）	10
	2026/8/21 （貯蔵中）	11

◆地下水（井戸）中の放射能濃度

測定地点	測定日＼測定項目	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
上流	2019/5/8 （稼働前）	ND	ND
	2026/8/21 （貯蔵中）	ND	ND
下流	2019/5/8 （稼働前）	ND	ND
	2026/8/21 （貯蔵中）	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

●地下水（集排水設備）中の放射能濃度

測定日＼測定項目	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
2019/5/21 （稼働前）	ND	ND
2026/8/6 （貯蔵中）	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

■放流先河川の放射能濃度

測定日＼測定項目	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
2019/4/24 （稼働前）	ND	ND
2026/8/21 （貯蔵中）	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

放射能濃度[Bq/L]の基準：セシウム134の濃度／60＋セシウム137の濃度／90≦1

※本工区の浸出水処理施設は2025年4月以降、稼働停止中。
浸出水処理は土壌貯蔵施設（大熊②工区）の浸出水処理施設において実施。

土壌貯蔵施設（双葉②工区）における
周辺環境測定結果（月次測定）2026年7月

◆地下水（井戸）中の電気伝導率等

測定地点	測定日 ＼ 測定項目	電気伝導率 (mS/m)
上流	2019/5/8 （稼働前）	61
	2026/7/7 （貯蔵中）	30
下流	2019/5/8 （稼働前）	18
	2026/7/7 （貯蔵中）	26

測定地点	測定日 ＼ 測定項目	塩化物イオン濃度 (mg/L)
上流	2019/5/8 （稼働前）	8.0
	2026/7/7 （貯蔵中）	4.9
下流	2019/5/8 （稼働前）	10
	2026/7/7 （貯蔵中）	9.3

◆地下水（井戸）中の放射能濃度

測定地点	測定日 ＼ 測定項目	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
上流	2019/5/8 （稼働前）	ND	ND
	2026/7/7 （貯蔵中）	ND	ND
下流	2019/5/8 （稼働前）	ND	ND
	2026/7/7 （貯蔵中）	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

●地下水（集排水設備）中の放射能濃度

測定日 ＼ 測定項目		Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
2019/5/21	（稼働前）	ND	ND
2026/7/7	（貯蔵中）	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

■放流先河川の放射能濃度

測定日 ＼ 測定項目		Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
2019/4/24	（稼働前）	ND	ND
2026/7/7	（貯蔵中）	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

放射能濃度[Bq/L]の基準：セシウム134の濃度／60＋セシウム137の濃度／90≦1

※本工区の浸出水処理施設は2025年4月以降、稼働停止中。
浸出水処理は土壌貯蔵施設（大熊②工区）の浸出水処理施設において実施。

土壌貯蔵施設（双葉②工区）における
周辺環境測定結果（月次測定）2026年6月

◆地下水（井戸）中の電気伝導率等

測定地点	測定日＼測定項目		電気伝導率 (mS/m)
上流	2019/5/8	（稼働前）	61
	2026/6/9	（貯蔵中）	31
下流	2019/5/8	（稼働前）	18
	2026/6/9	（貯蔵中）	26

測定地点	測定日＼測定項目		塩化物イオン濃度 (mg/L)
上流	2019/5/8	（稼働前）	8.0
	2026/6/9	（貯蔵中）	6.6
下流	2019/5/8	（稼働前）	10
	2026/6/9	（貯蔵中）	12

◆地下水（井戸）中の放射能濃度

測定地点	測定日＼測定項目		Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
上流	2019/5/8	（稼働前）	ND	ND
	2026/6/9	（貯蔵中）	ND	ND
下流	2019/5/8	（稼働前）	ND	ND
	2026/6/9	（貯蔵中）	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

●地下水（集排水設備）中の放射能濃度

測定日＼測定項目		Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
2019/5/21	（稼働前）	ND	ND
2026/6/9	（貯蔵中）	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

■放流先河川の放射能濃度

測定日＼測定項目		Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
2019/4/24	（稼働前）	ND	ND
2026/6/9	（貯蔵中）	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

放射能濃度[Bq/L]の基準：セシウム134の濃度／60＋セシウム137の濃度／90≦1

※本工区の浸出水処理施設は2025年4月以降、稼働停止中。
浸出水処理は土壌貯蔵施設（大熊②工区）の浸出水処理施設において実施。

土壌貯蔵施設（双葉②工区）における
周辺環境測定結果（月次測定）2026年5月

◆地下水（井戸）中の電気伝導率等

測定地点	測定日＼測定項目	電気伝導率 (mS/m)
上流	2019/5/8 （稼働前）	61
	2026/5/12 （貯蔵中）	50
下流	2019/5/8 （稼働前）	18
	2026/5/12 （貯蔵中）	26

測定地点	測定日＼測定項目	塩化物イオン濃度 (mg/L)
上流	2019/5/8 （稼働前）	8.0
	2026/5/12 （貯蔵中）	10
下流	2019/5/8 （稼働前）	10
	2026/5/12 （貯蔵中）	15

◆地下水（井戸）中の放射能濃度

測定地点	測定日＼測定項目	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
上流	2019/5/8 （稼働前）	ND	ND
	2026/5/12 （貯蔵中）	ND	ND
下流	2019/5/8 （稼働前）	ND	ND
	2026/5/12 （貯蔵中）	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

●地下水（集排水設備）中の放射能濃度

測定日＼測定項目	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
2019/5/21 （稼働前）	ND	ND
2026/5/12 （貯蔵中）	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

■放流先河川の放射能濃度

測定日＼測定項目	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
2019/4/24 （稼働前）	ND	ND
2026/5/12 （貯蔵中）	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

放射能濃度[Bq/L]の基準：セシウム134の濃度／60＋セシウム137の濃度／90≦1

※本工区の浸出水処理施設は2025年4月以降、稼働停止中。
浸出水処理は土壌貯蔵施設（大熊②工区）の浸出水処理施設において実施。

土壌貯蔵施設（双葉②工区）における
周辺環境測定結果（月次測定）2026年4月

◆地下水（井戸）中の電気伝導率等

測定地点	測定項目 / 測定日		電気伝導率 (mS/m)
上流	2019/5/8	（稼働前）	61
	2026/4/9	（貯蔵中）	33
下流	2019/5/8	（稼働前）	18
	2026/4/9	（貯蔵中）	24

測定地点	測定項目 / 測定日		塩化物イオン濃度 (mg/L)
上流	2019/5/8	（稼働前）	8.0
	2026/4/9	（貯蔵中）	13
下流	2019/5/8	（稼働前）	10
	2026/4/9	（貯蔵中）	11

◆地下水（井戸）中の放射能濃度

測定地点	測定項目 / 測定日		Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
上流	2019/5/8	（稼働前）	ND	ND
	2026/4/9	（貯蔵中）	ND	ND
下流	2019/5/8	（稼働前）	ND	ND
	2026/4/9	（貯蔵中）	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

●地下水（集排水設備）中の放射能濃度

測定項目 / 測定日		Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
2019/5/21	（稼働前）	ND	ND
2026/4/7	（貯蔵中）	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

■放流先河川の放射能濃度

測定項目 / 測定日		Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
2019/4/24	（稼働前）	ND	ND
2026/4/9	（貯蔵中）	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

放射能濃度[Bq/L]の基準：セシウム134の濃度／60＋セシウム137の濃度／90≦1

※本工区の浸出水処理施設は2025年4月以降、稼働停止中。
浸出水処理は土壌貯蔵施設（大熊②工区）の浸出水処理施設において実施。
